


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
TOPO	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Appro PF	06/06/2019 08:00	19/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

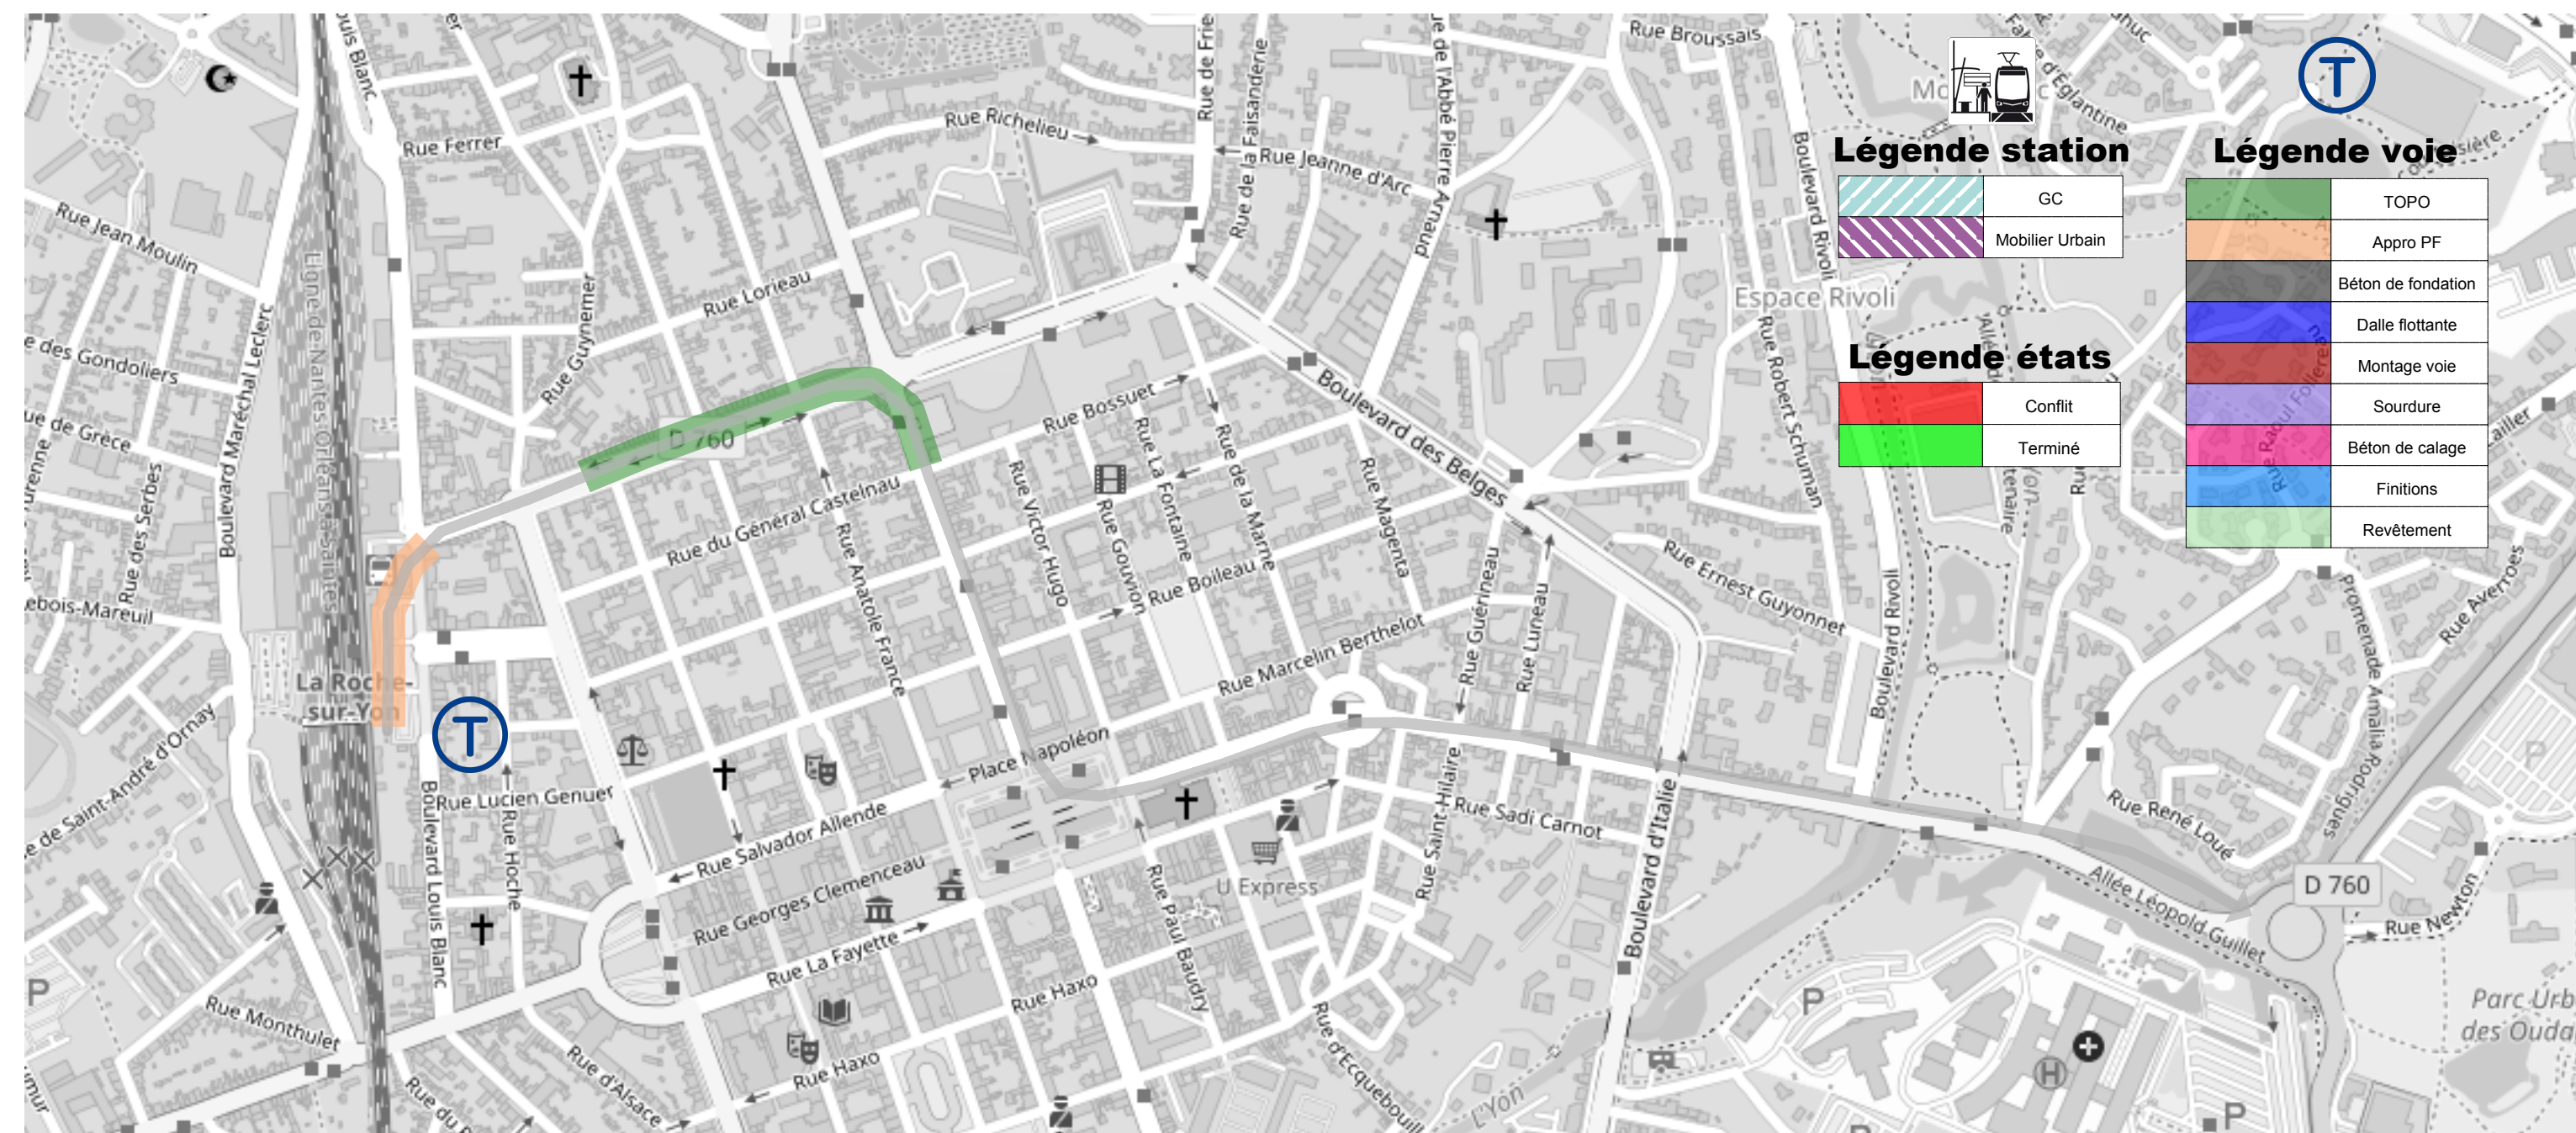

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement


Légende états

	Conflit
	Terminé


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
TOPO	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Appro PF	06/06/2019 08:00	19/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

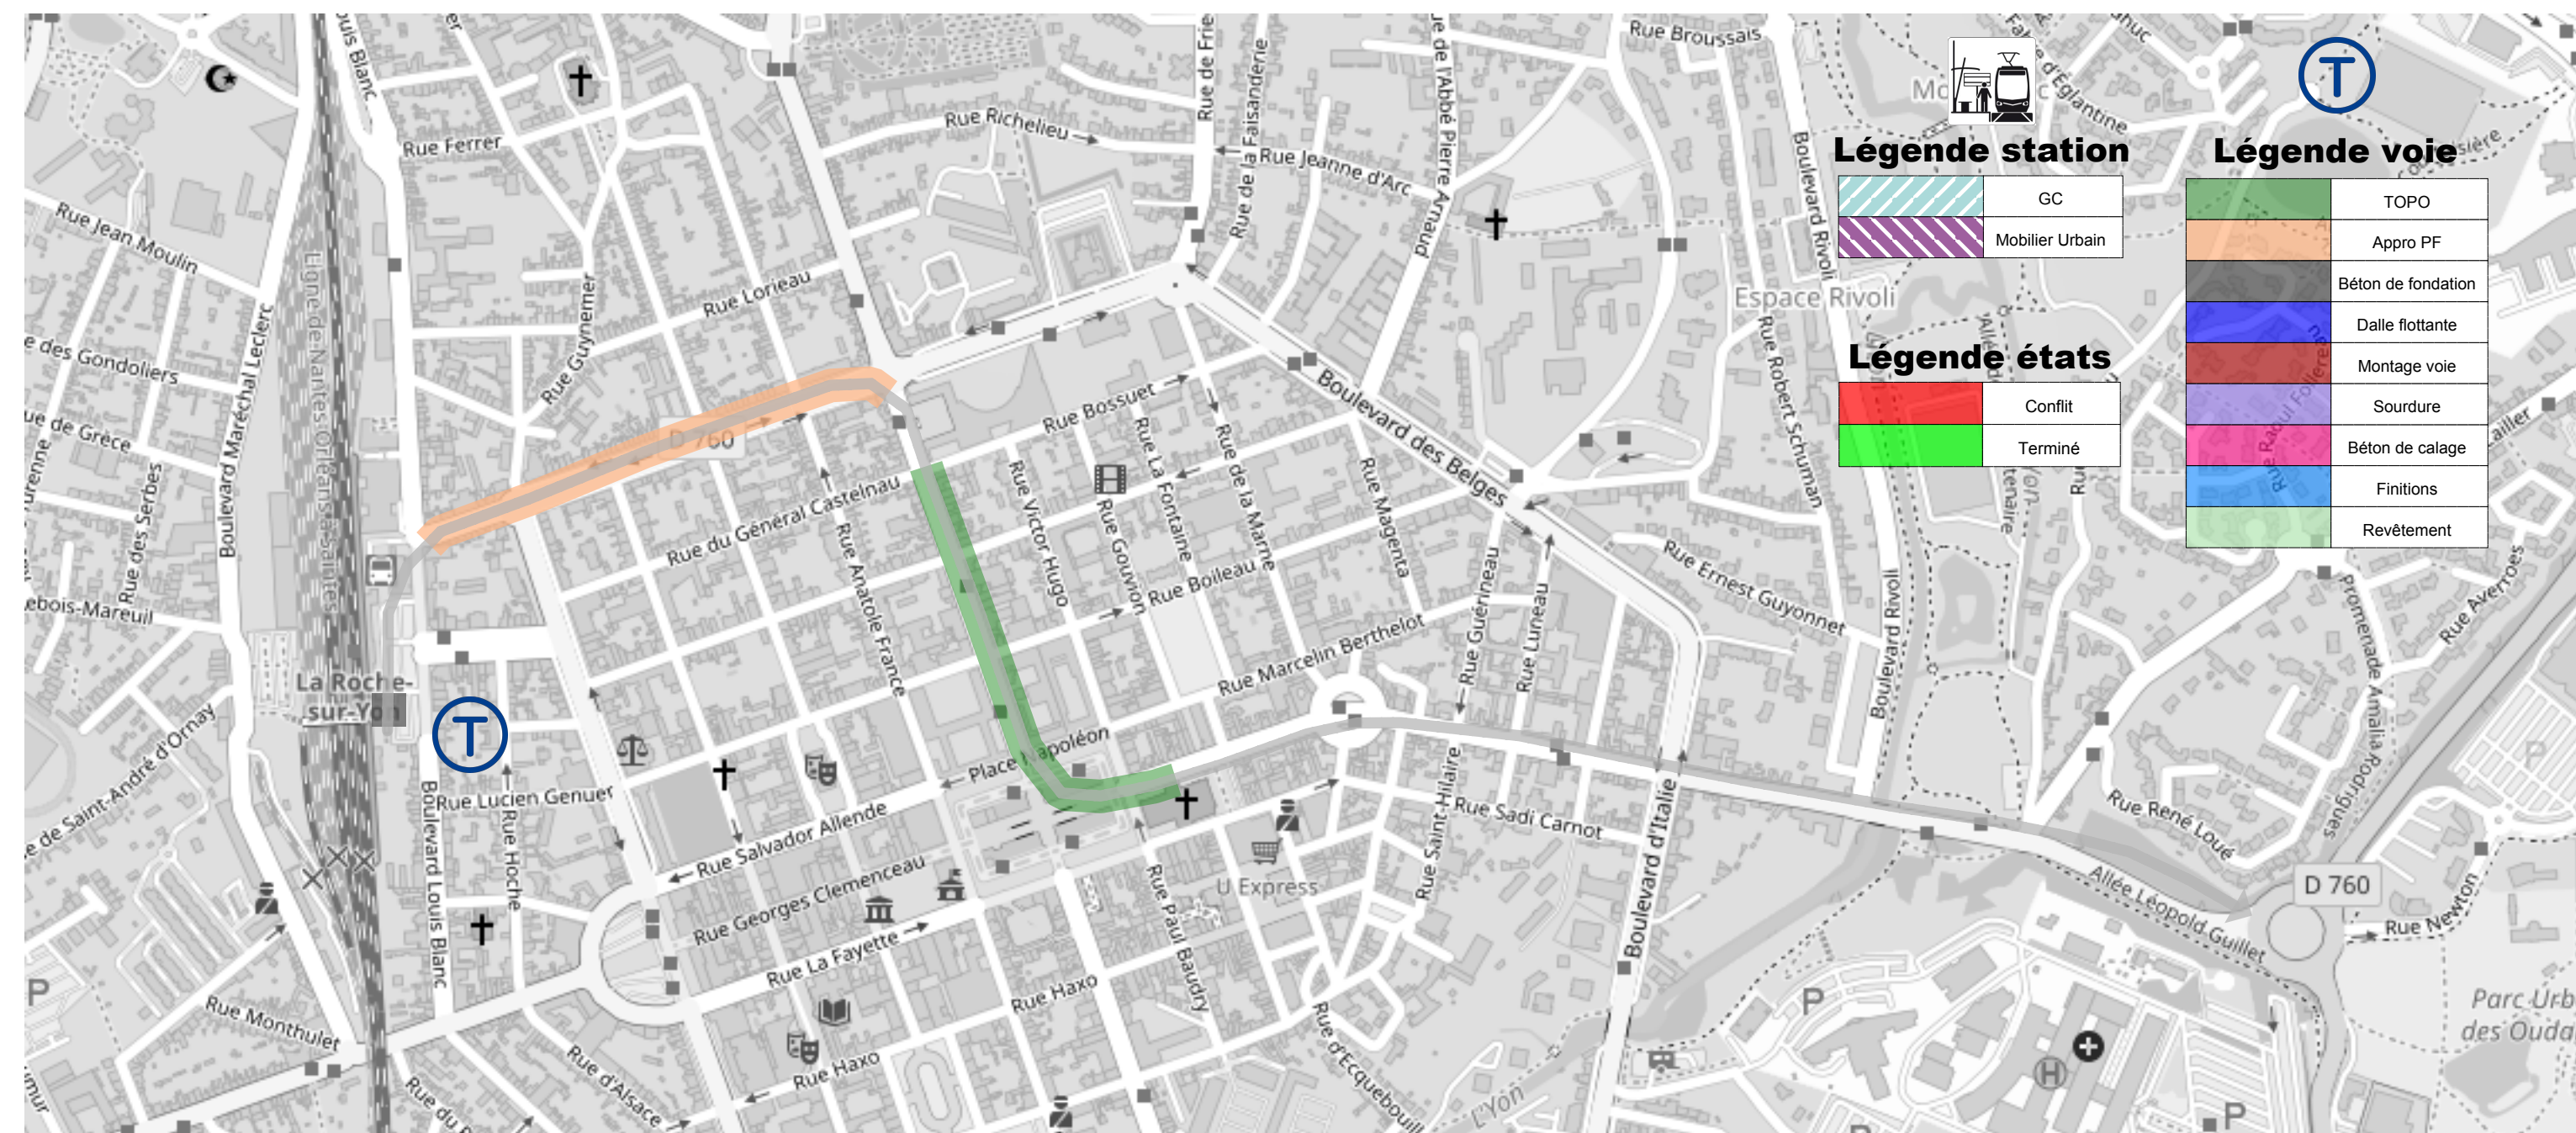


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
TOPO	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Appro PF	06/06/2019 08:00	19/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

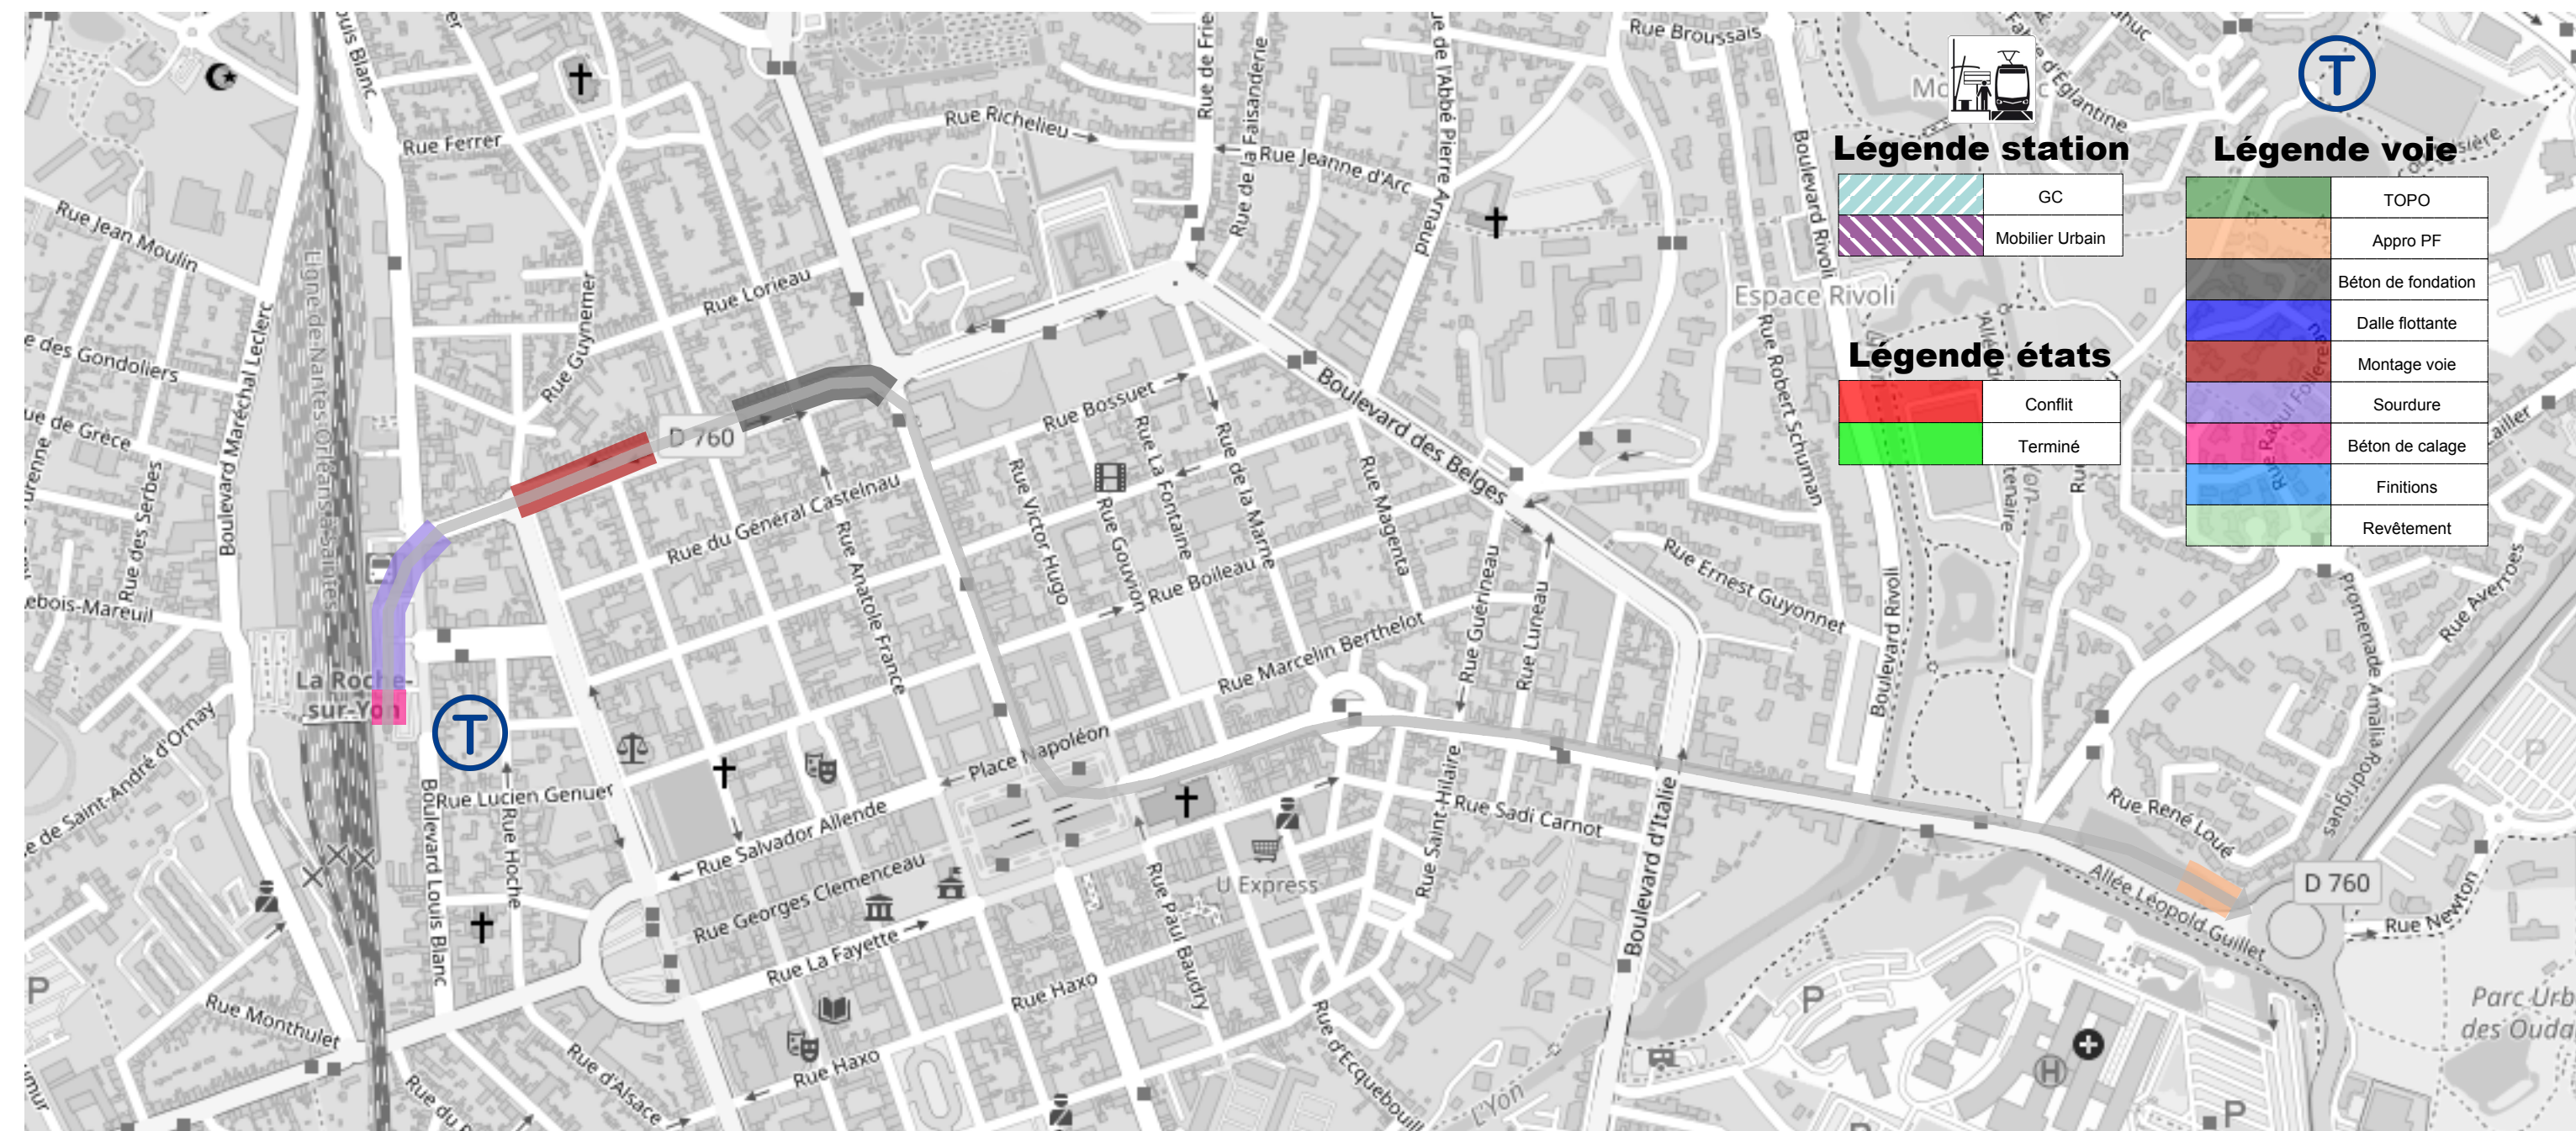


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

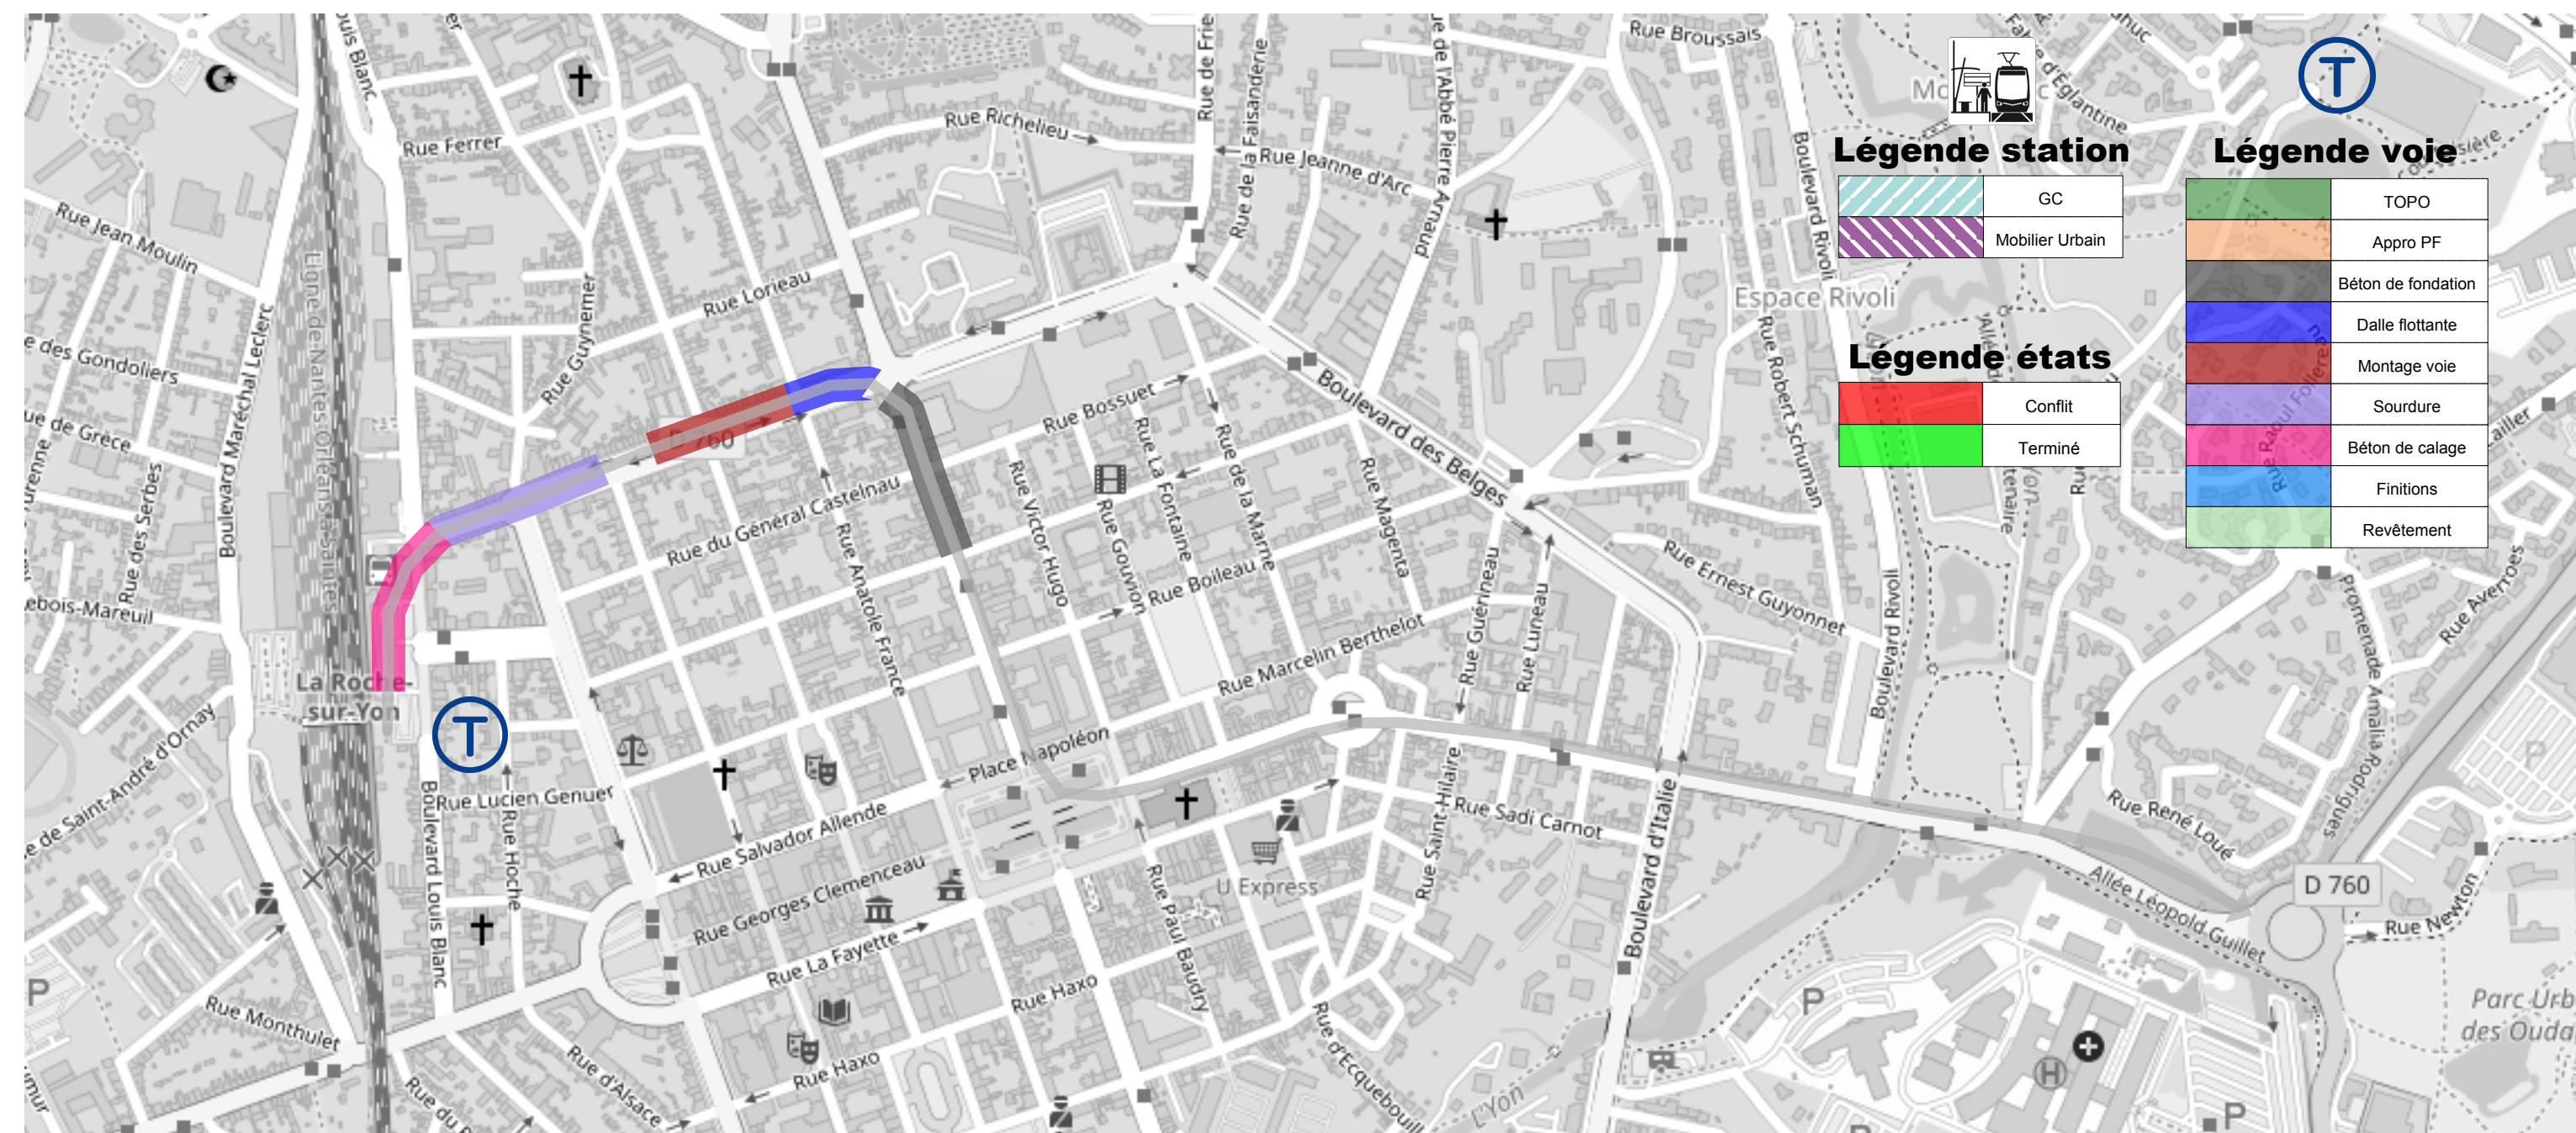

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Appro PF	06/06/2019 08:00	19/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

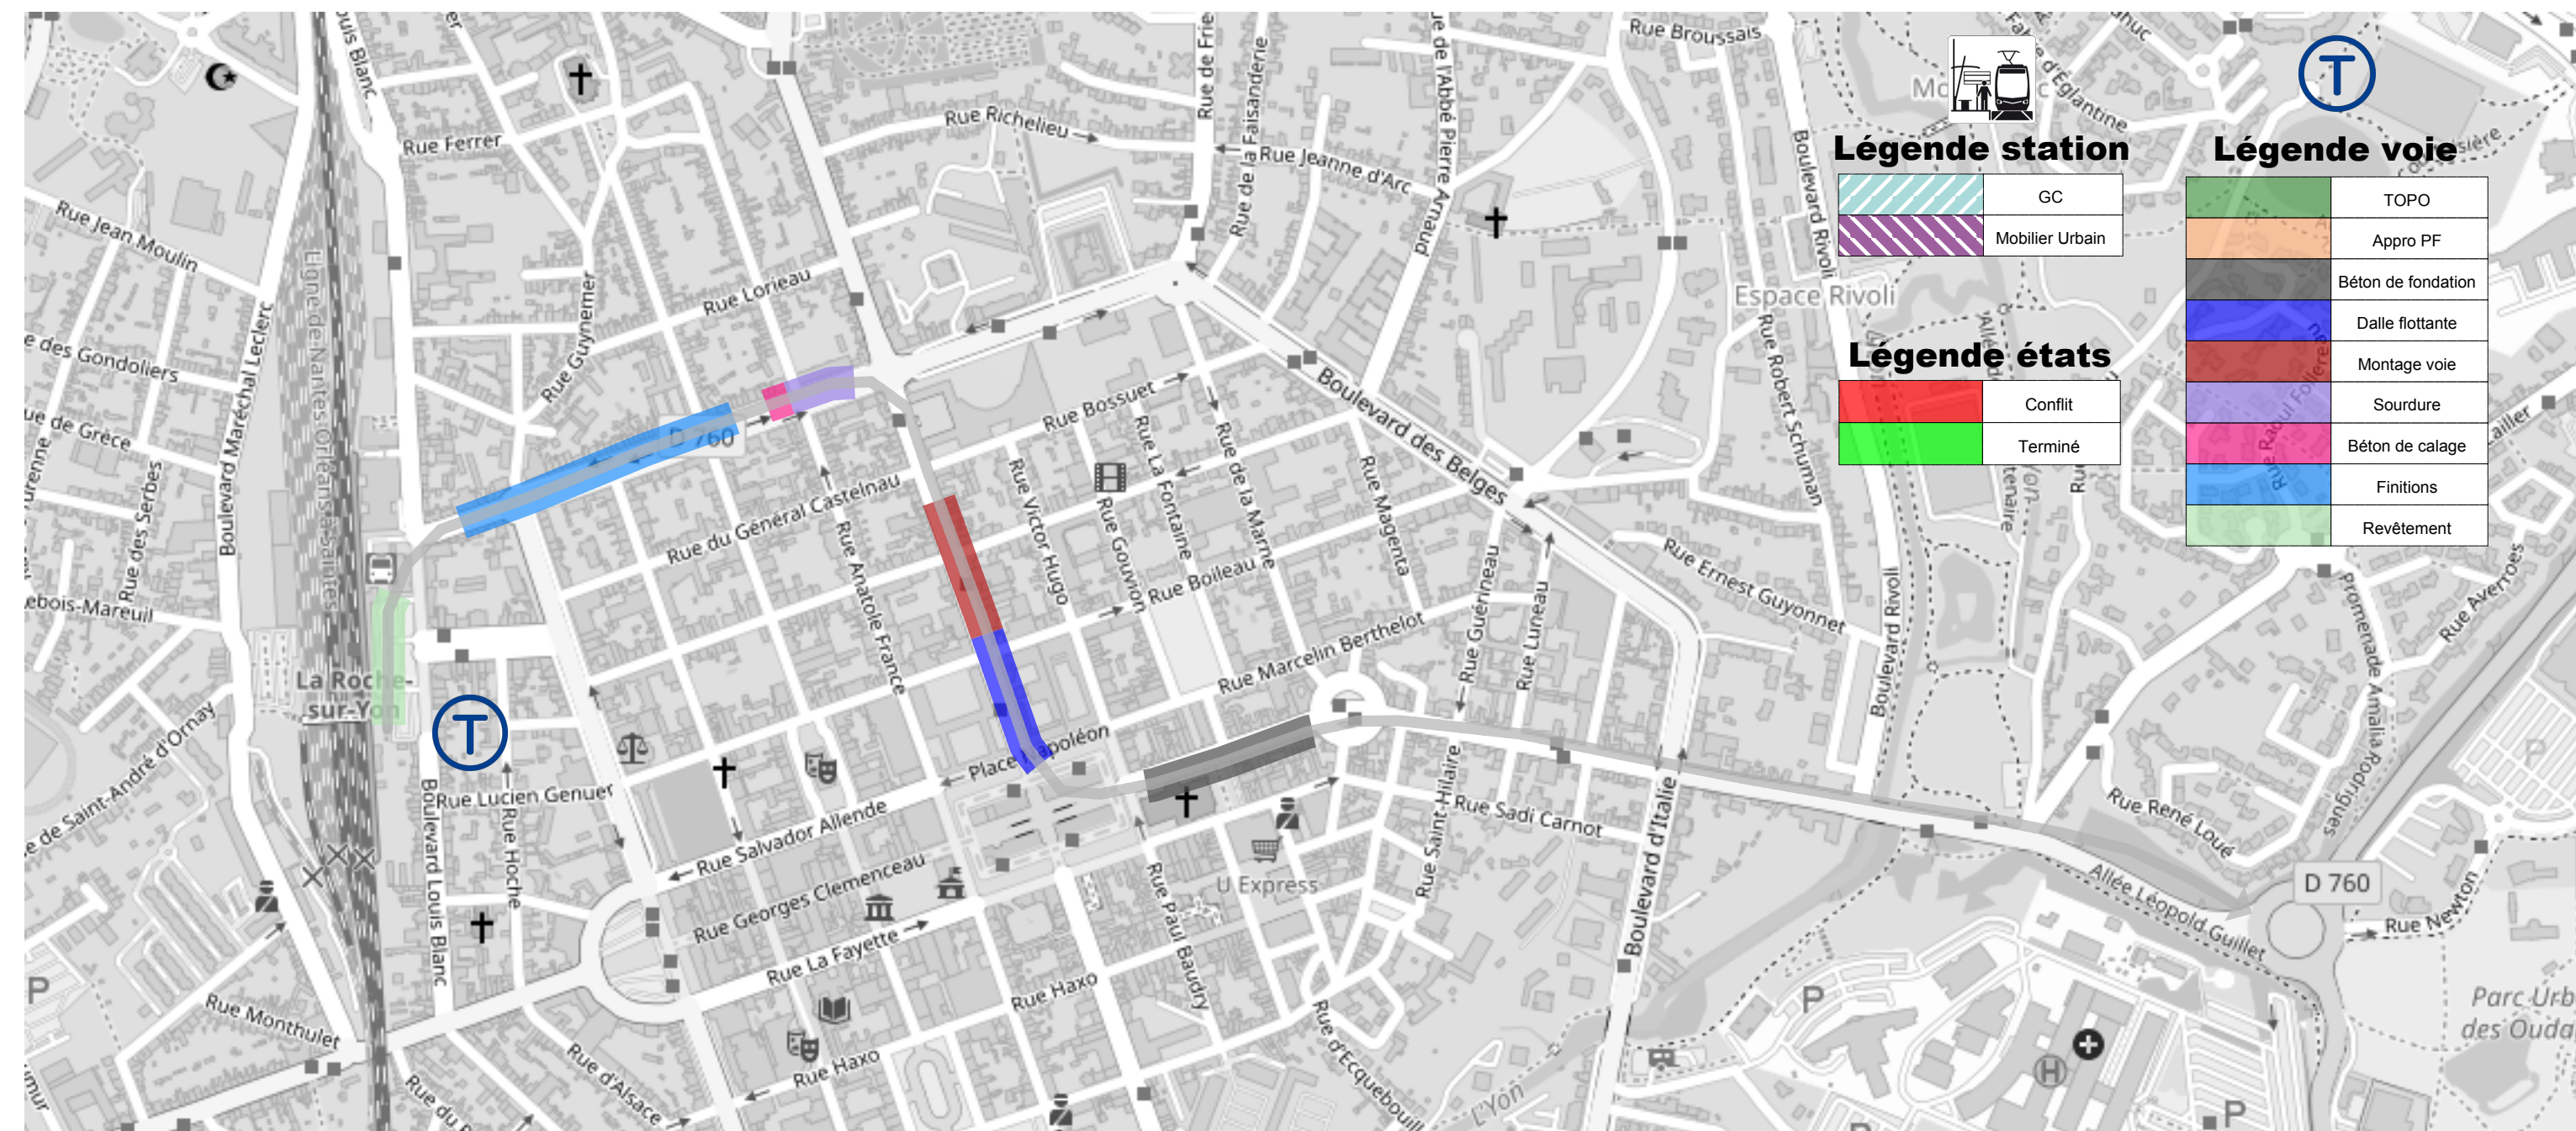

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
TOPO	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Appro PF	06/06/2019 08:00	19/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

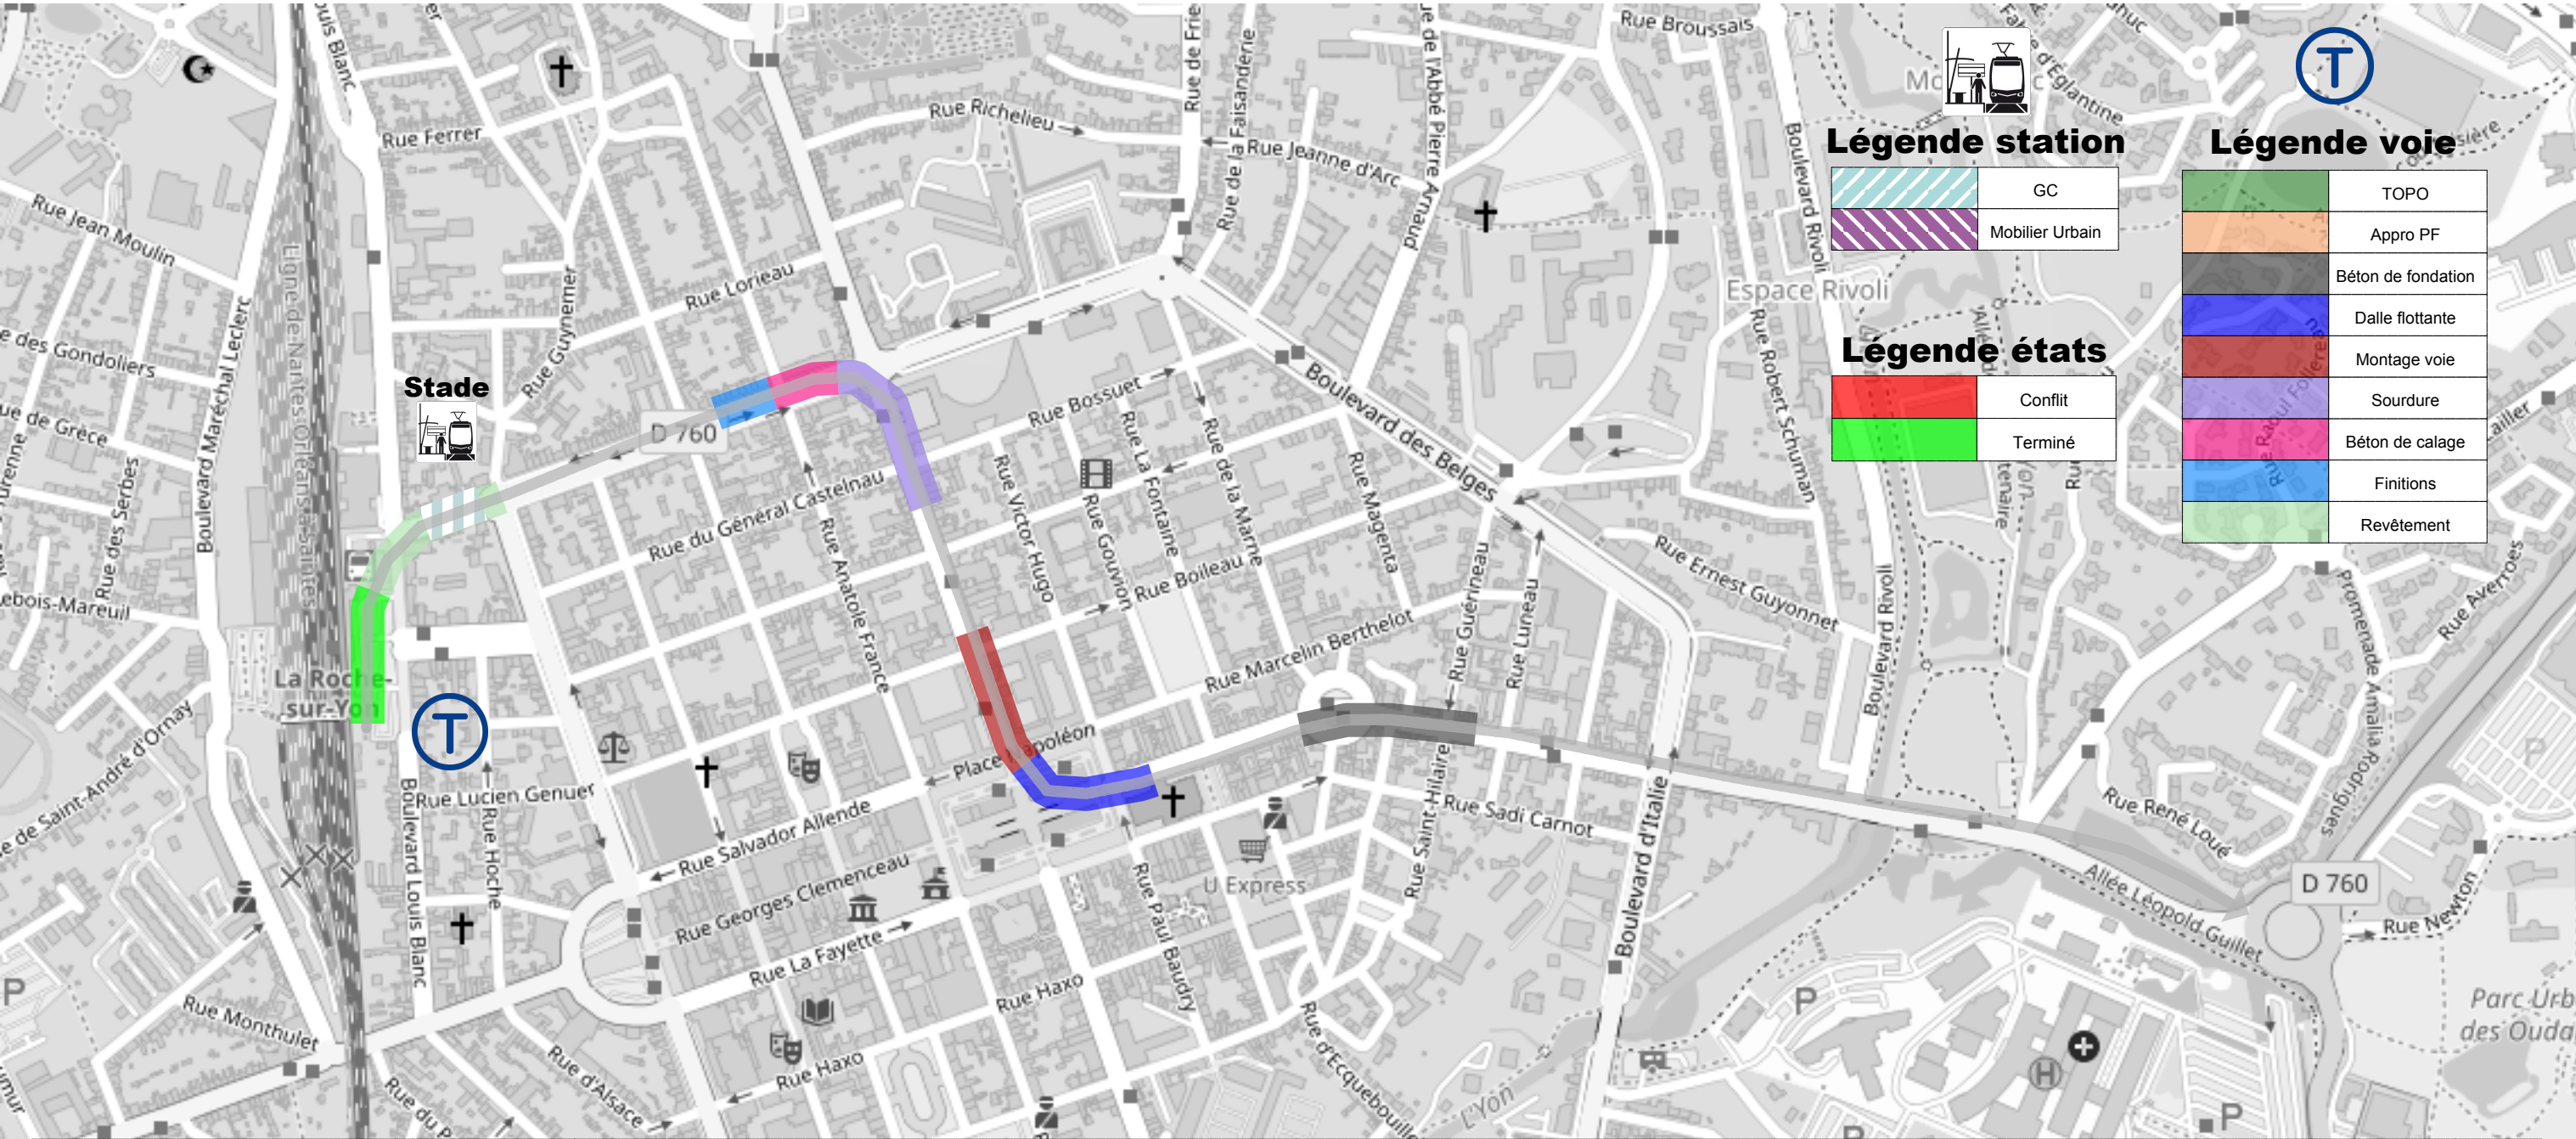

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement

Légende états

	Conflit
	Terminé

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Appro PF	06/06/2019 08:00	19/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

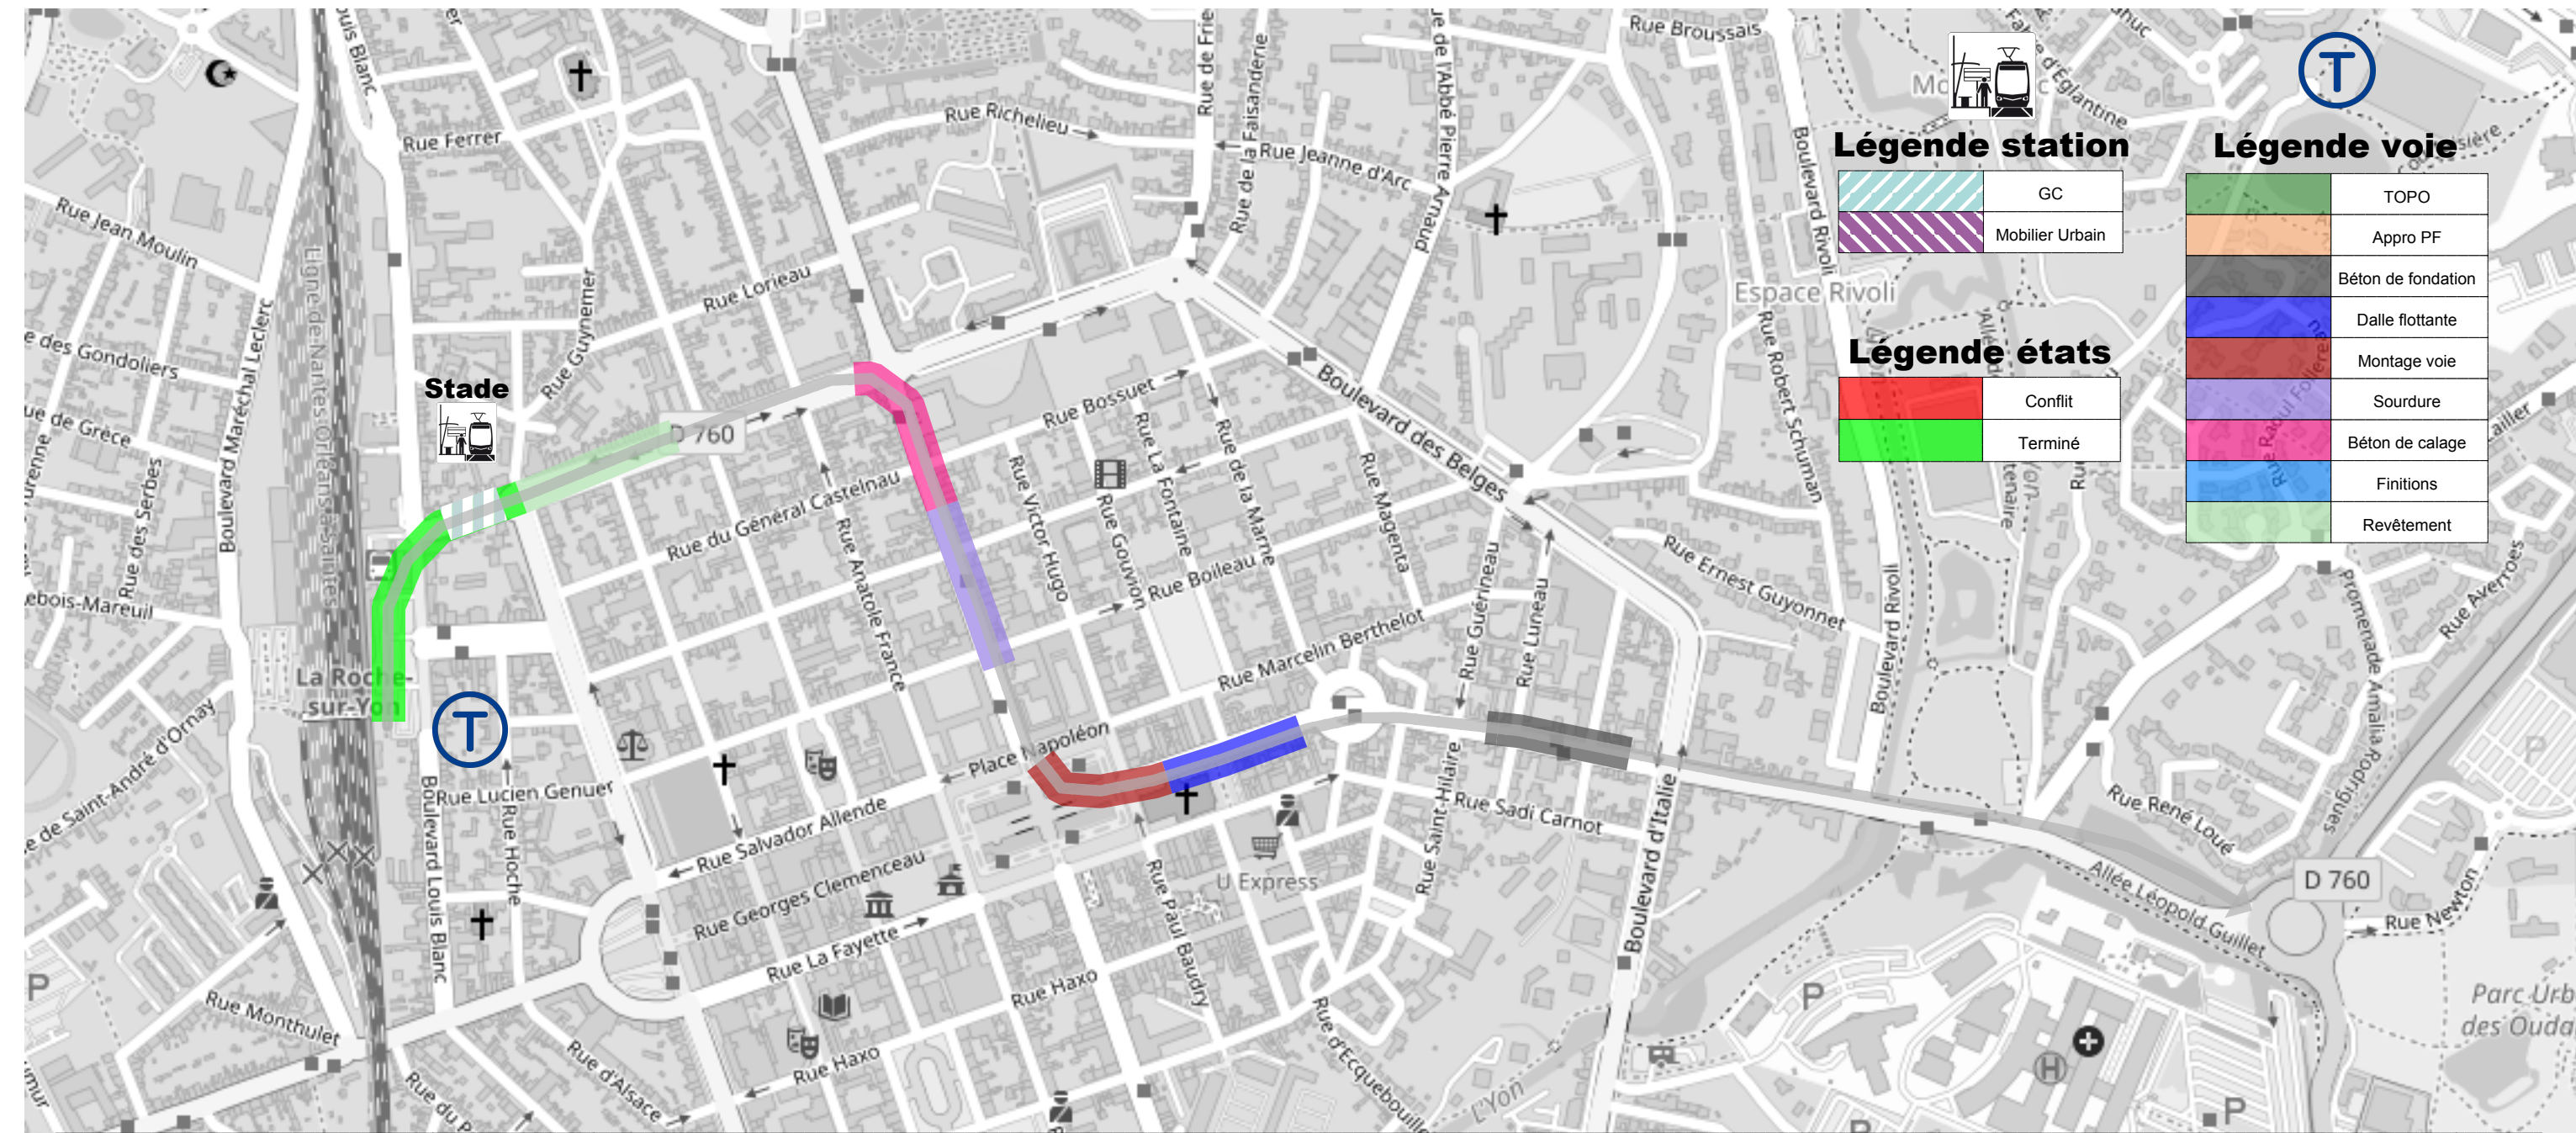

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement

Légende états

	Conflit
	Terminé

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00													
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00													
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20													
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00													
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00													
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00													
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20													
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40													
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20													
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00													
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00													
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00													
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20													
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40													
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40													
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20													
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00													
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00													
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40													
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20													
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20													
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00													
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20													
Station Stade															
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00													
Station E.Marcel															
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00													
Station Présidents															
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00													
Station Maréchal															
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00													
Station Liberté															
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00													
Station Egalité															
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00													
Station Fraternité															
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00													

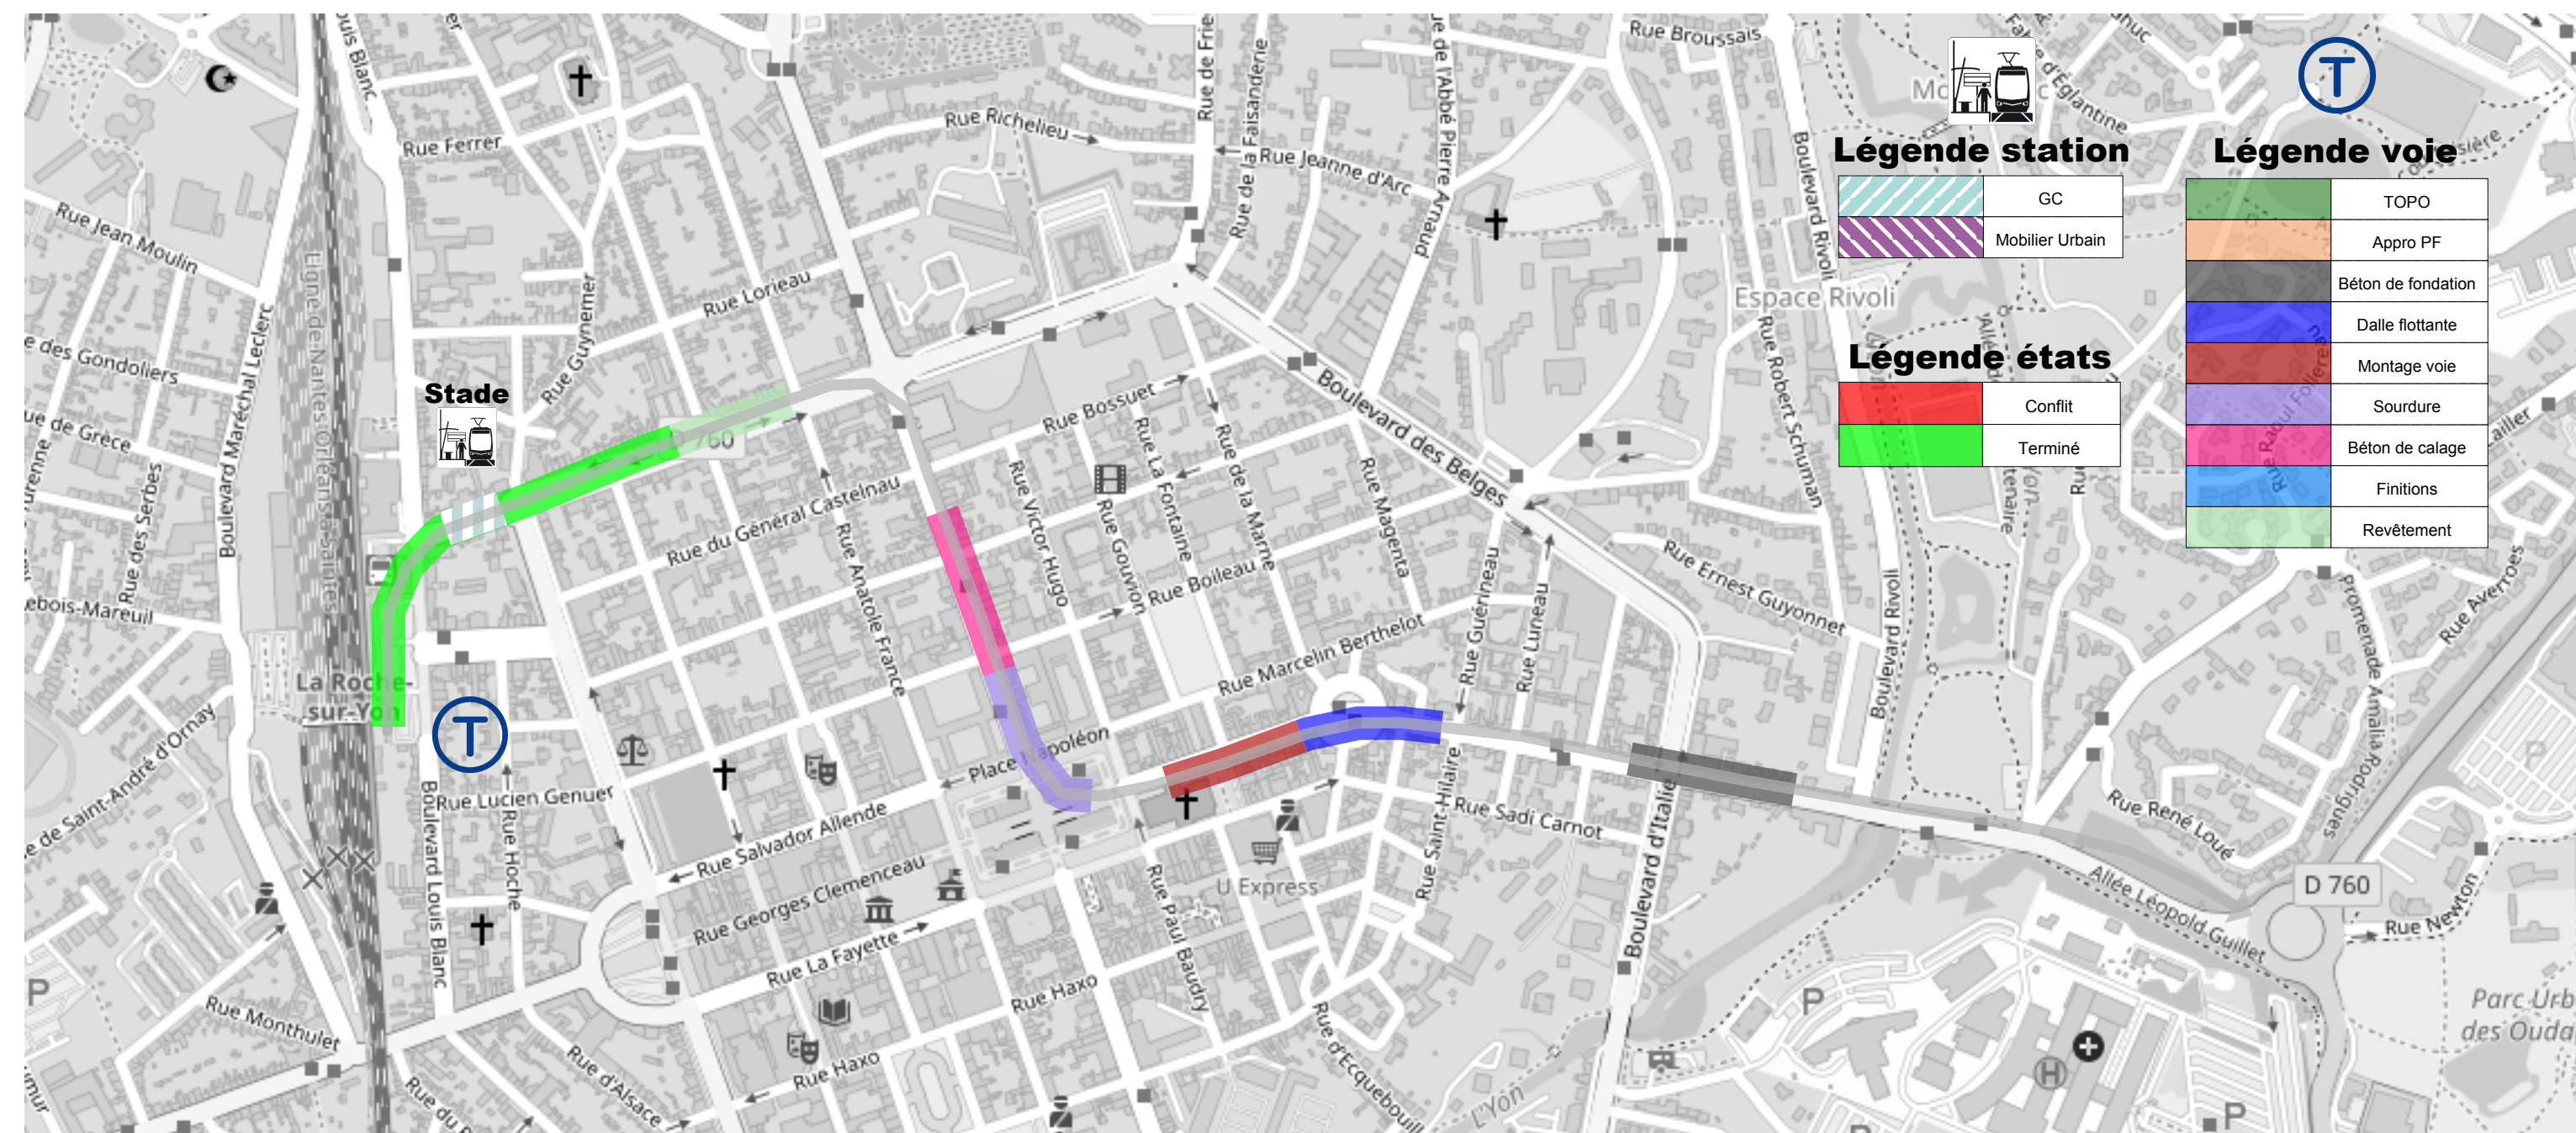

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement


Légende états

	Conflit
	Terminé


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00													
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00													
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20													
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00													
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20													
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20													
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00													
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20													
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00													
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00													
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00													
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00													
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00													
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00													
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00													

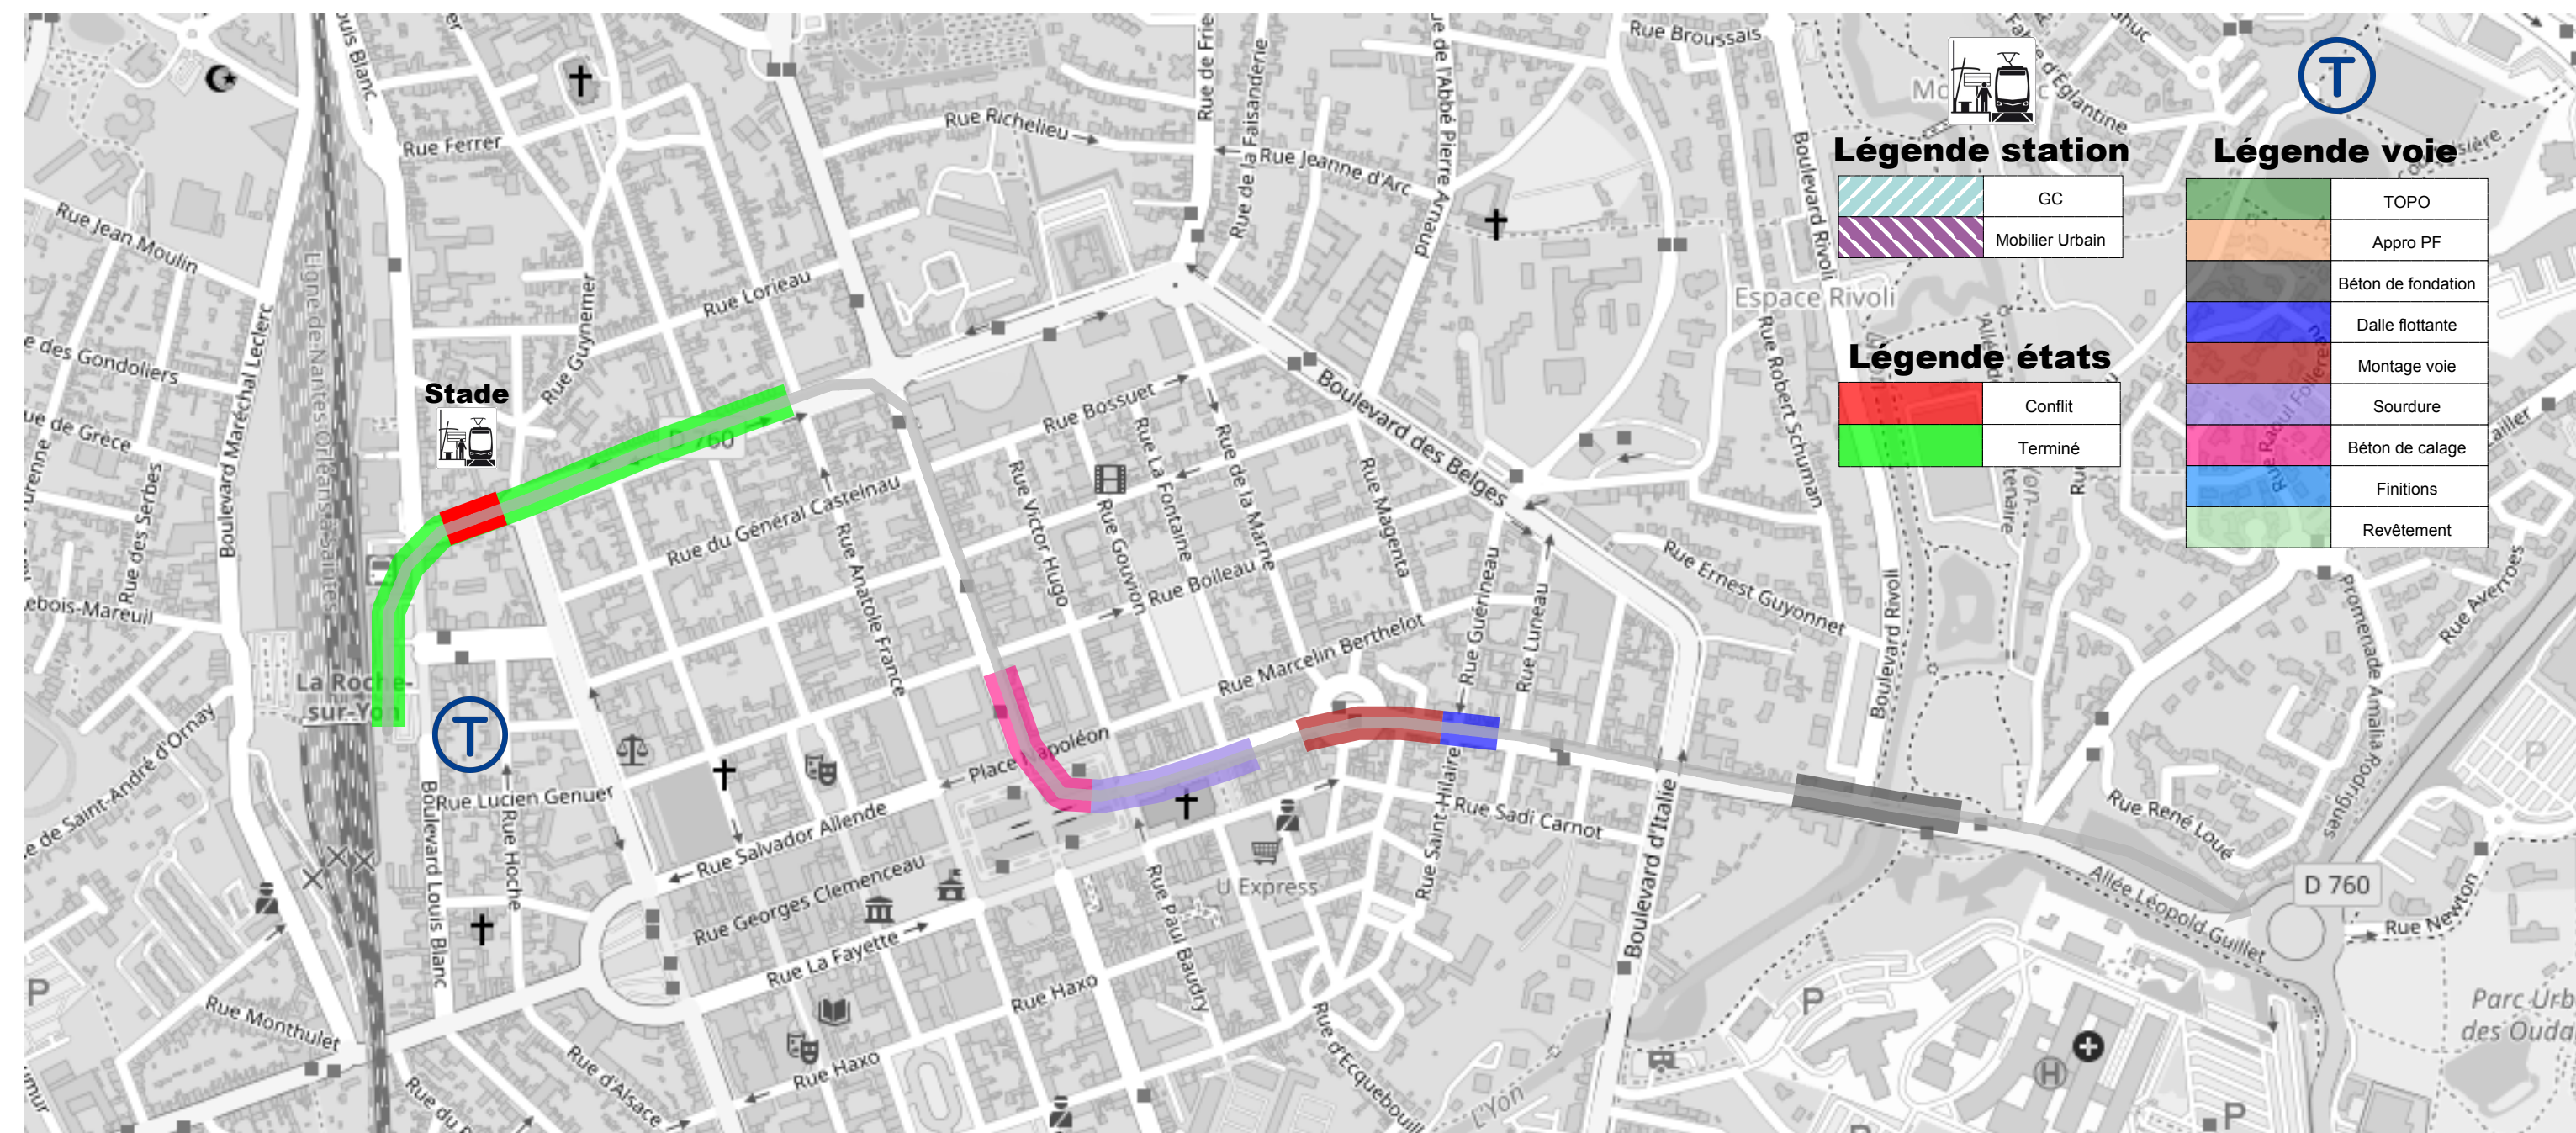


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

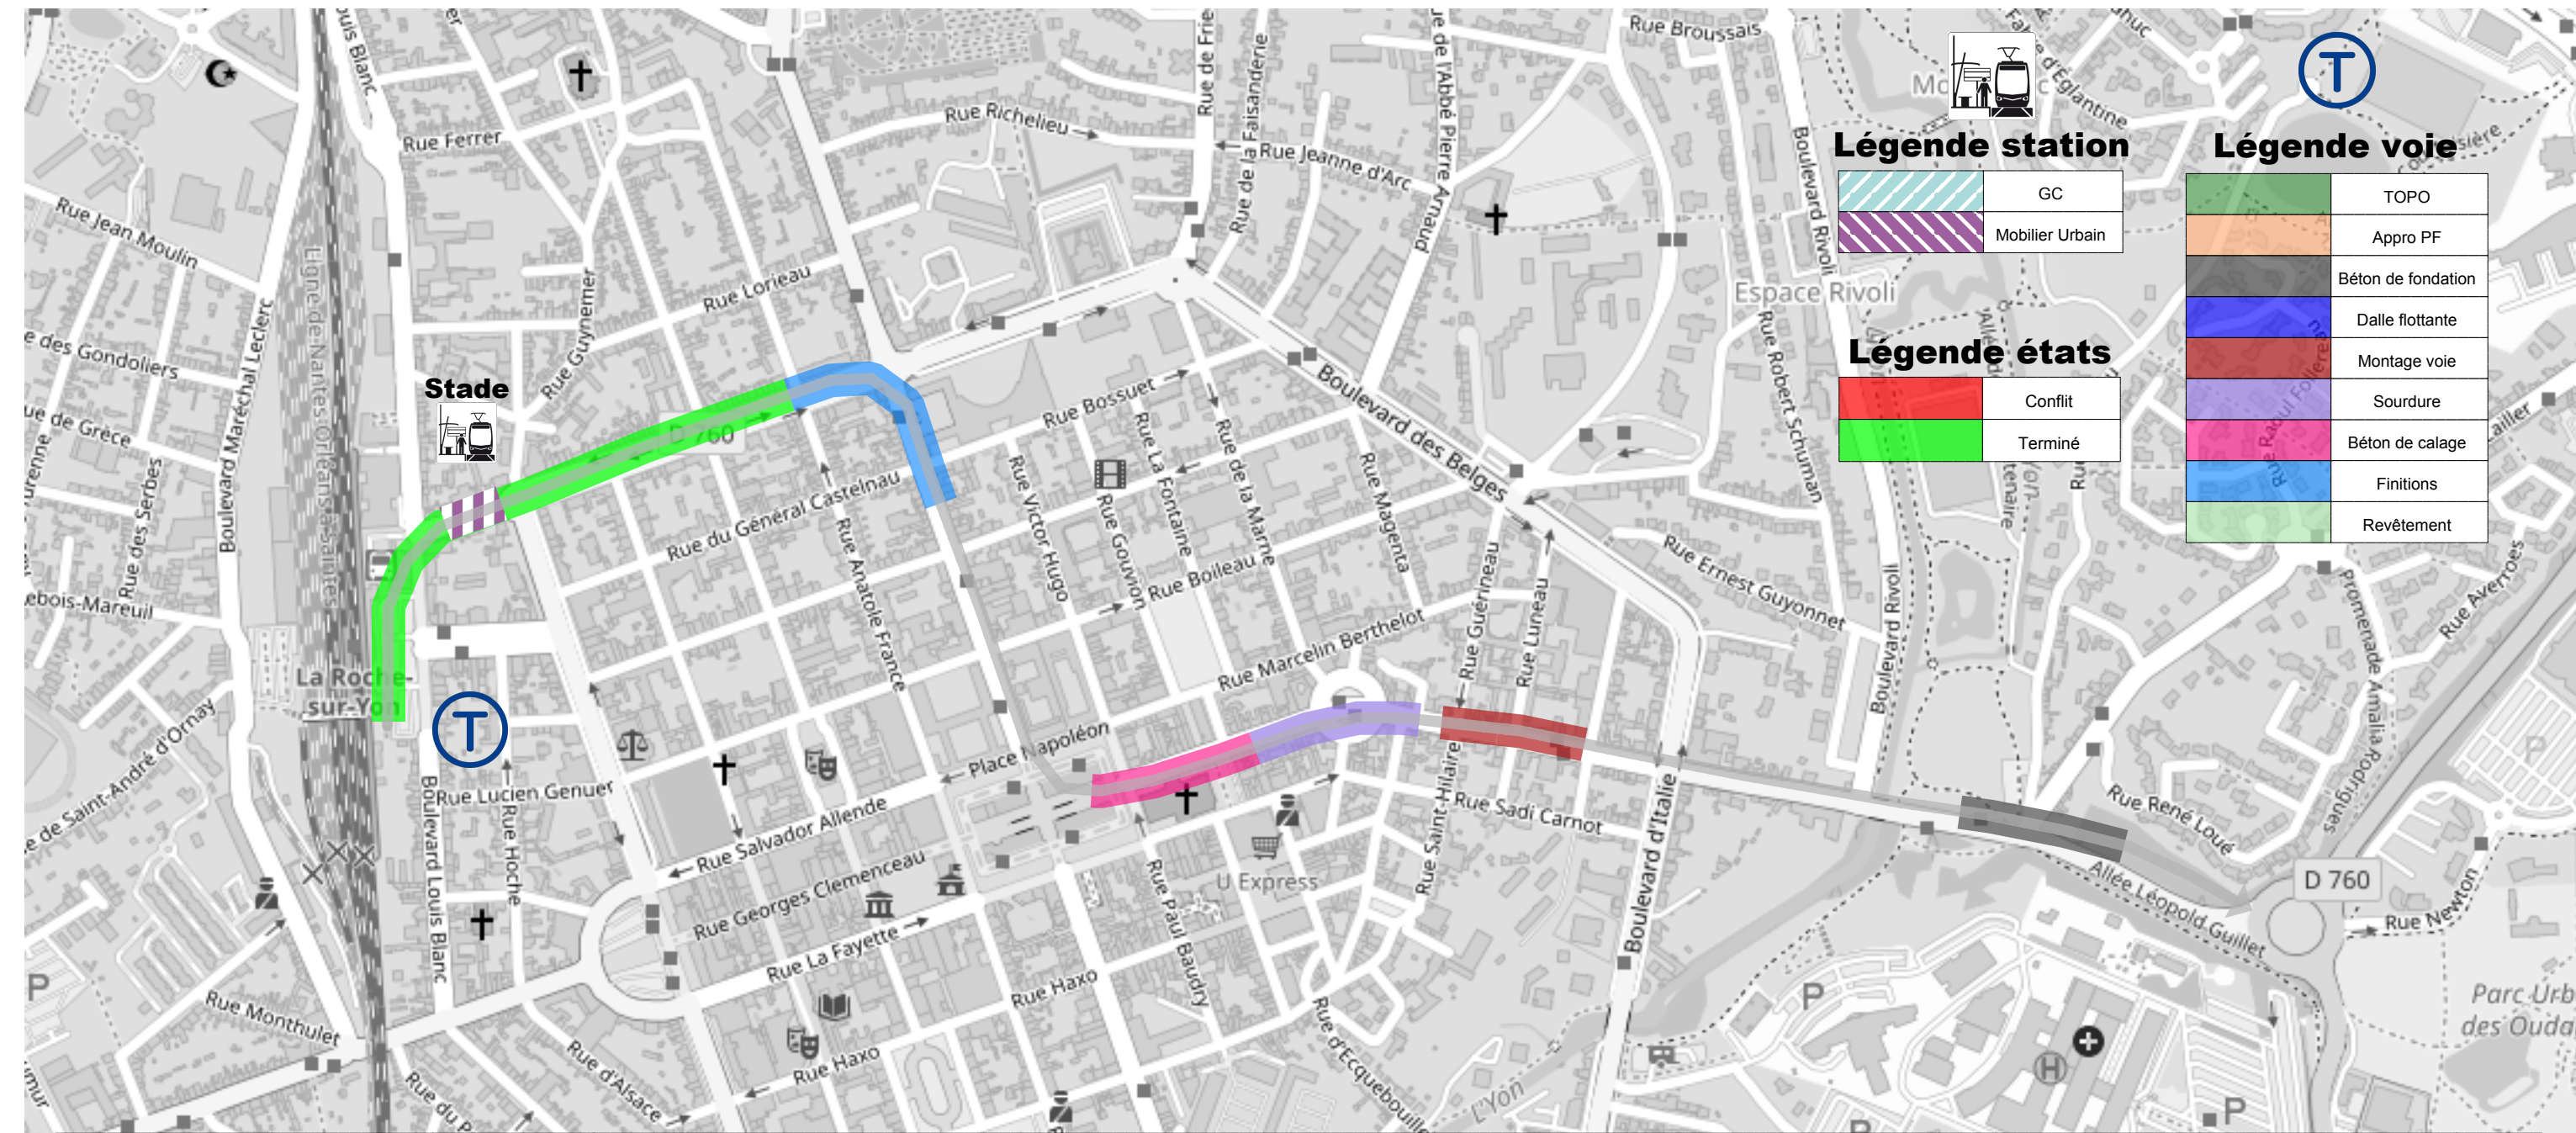

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

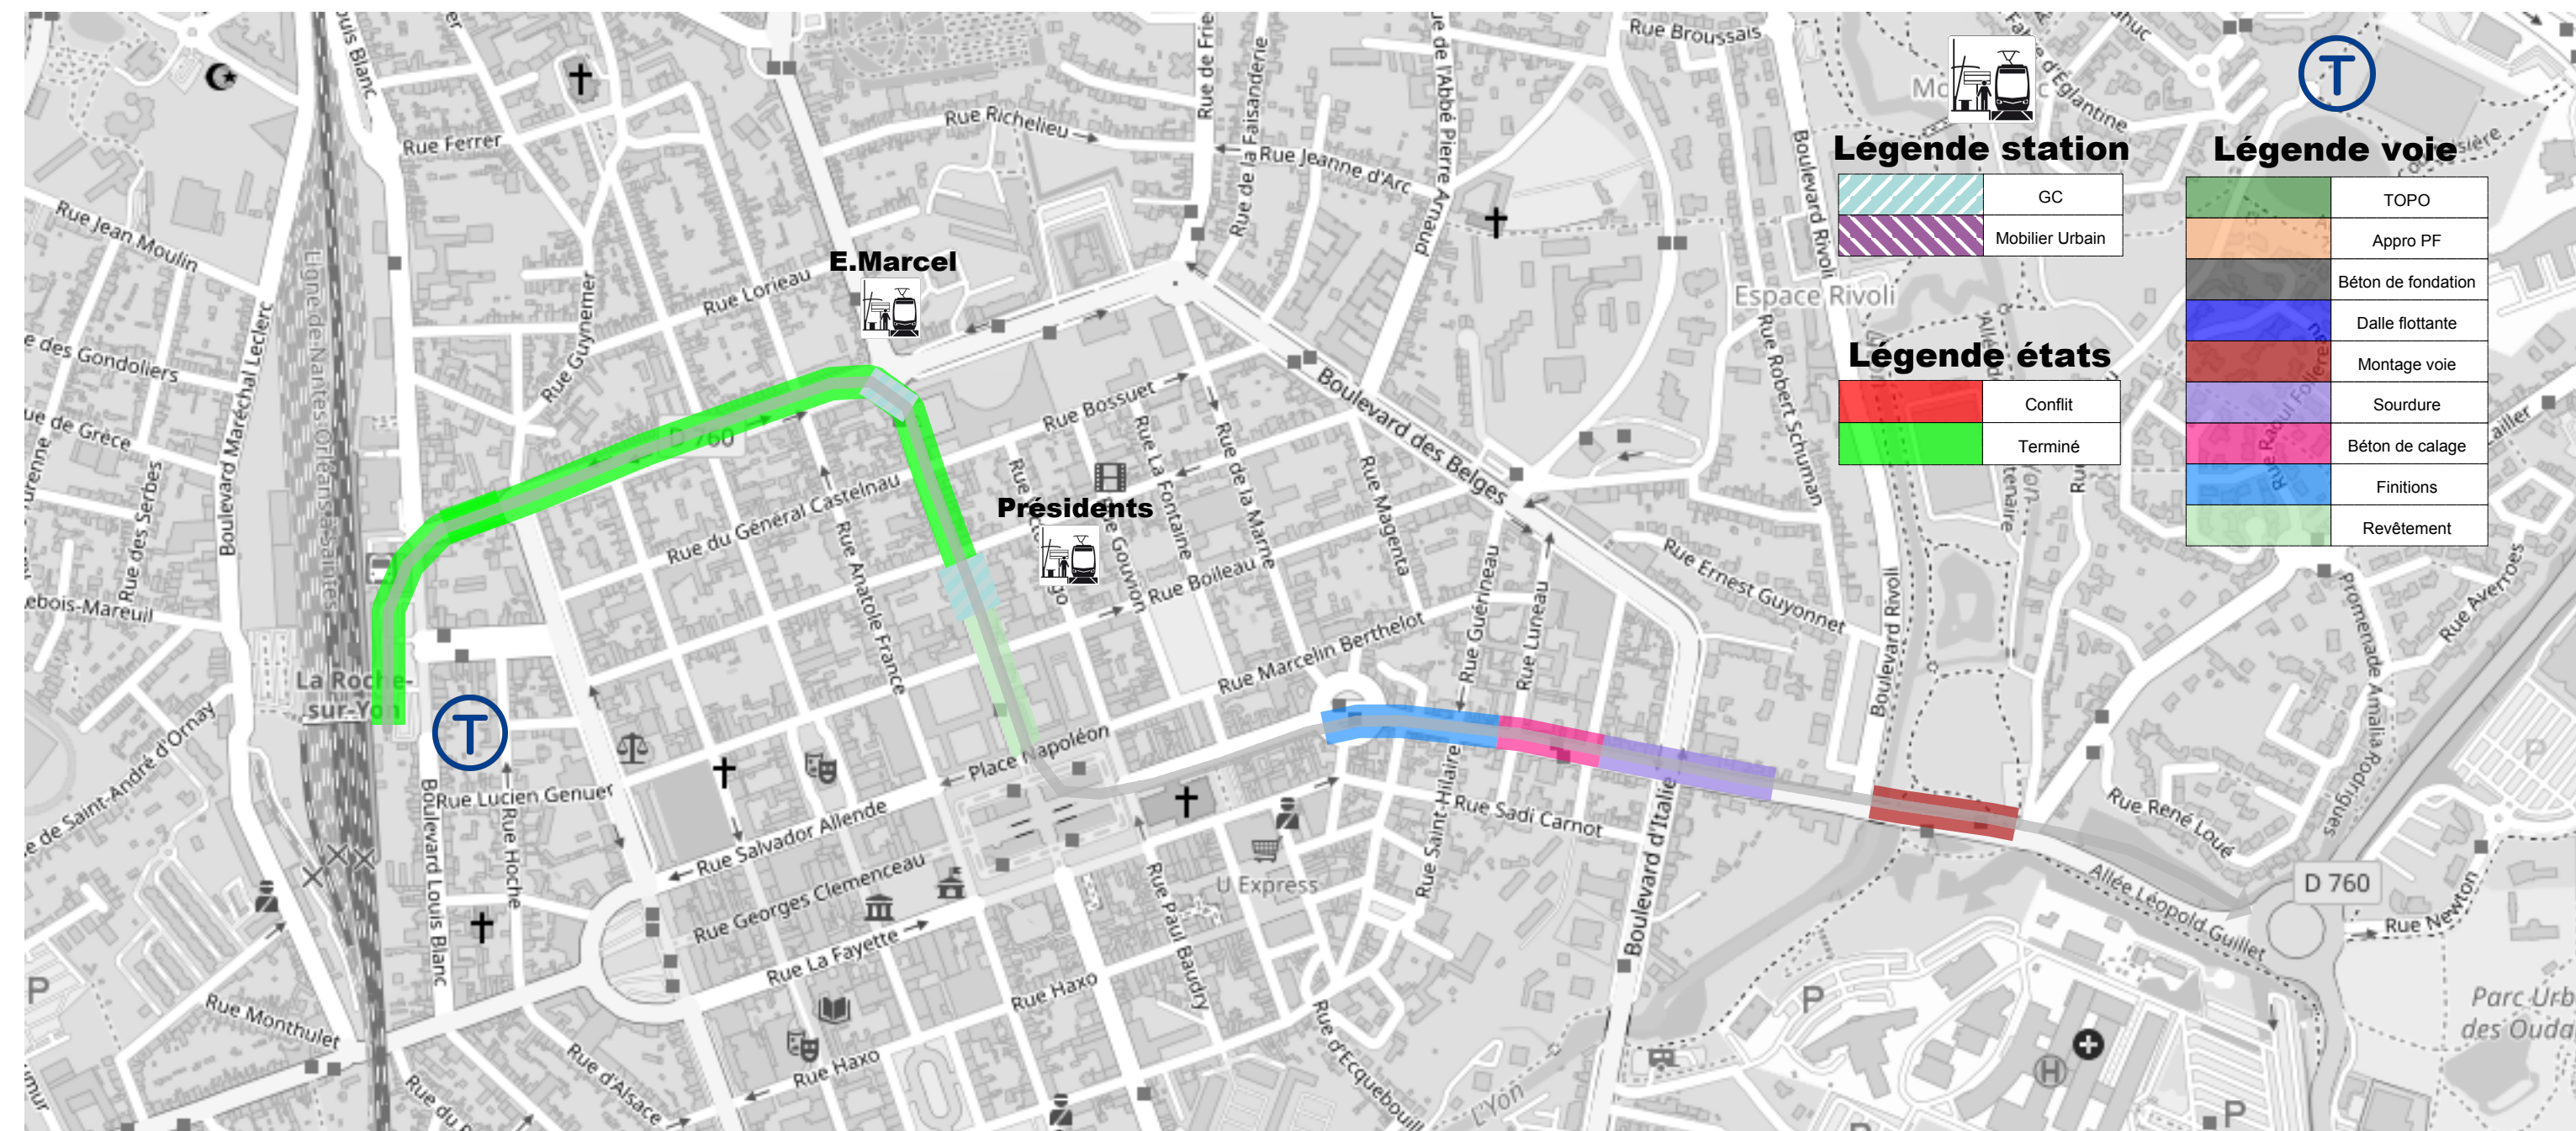

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E. Marcel			Station E. Marcel												
GC - E. Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E. Marcel												
Mobilier Urbain - E. Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E. Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

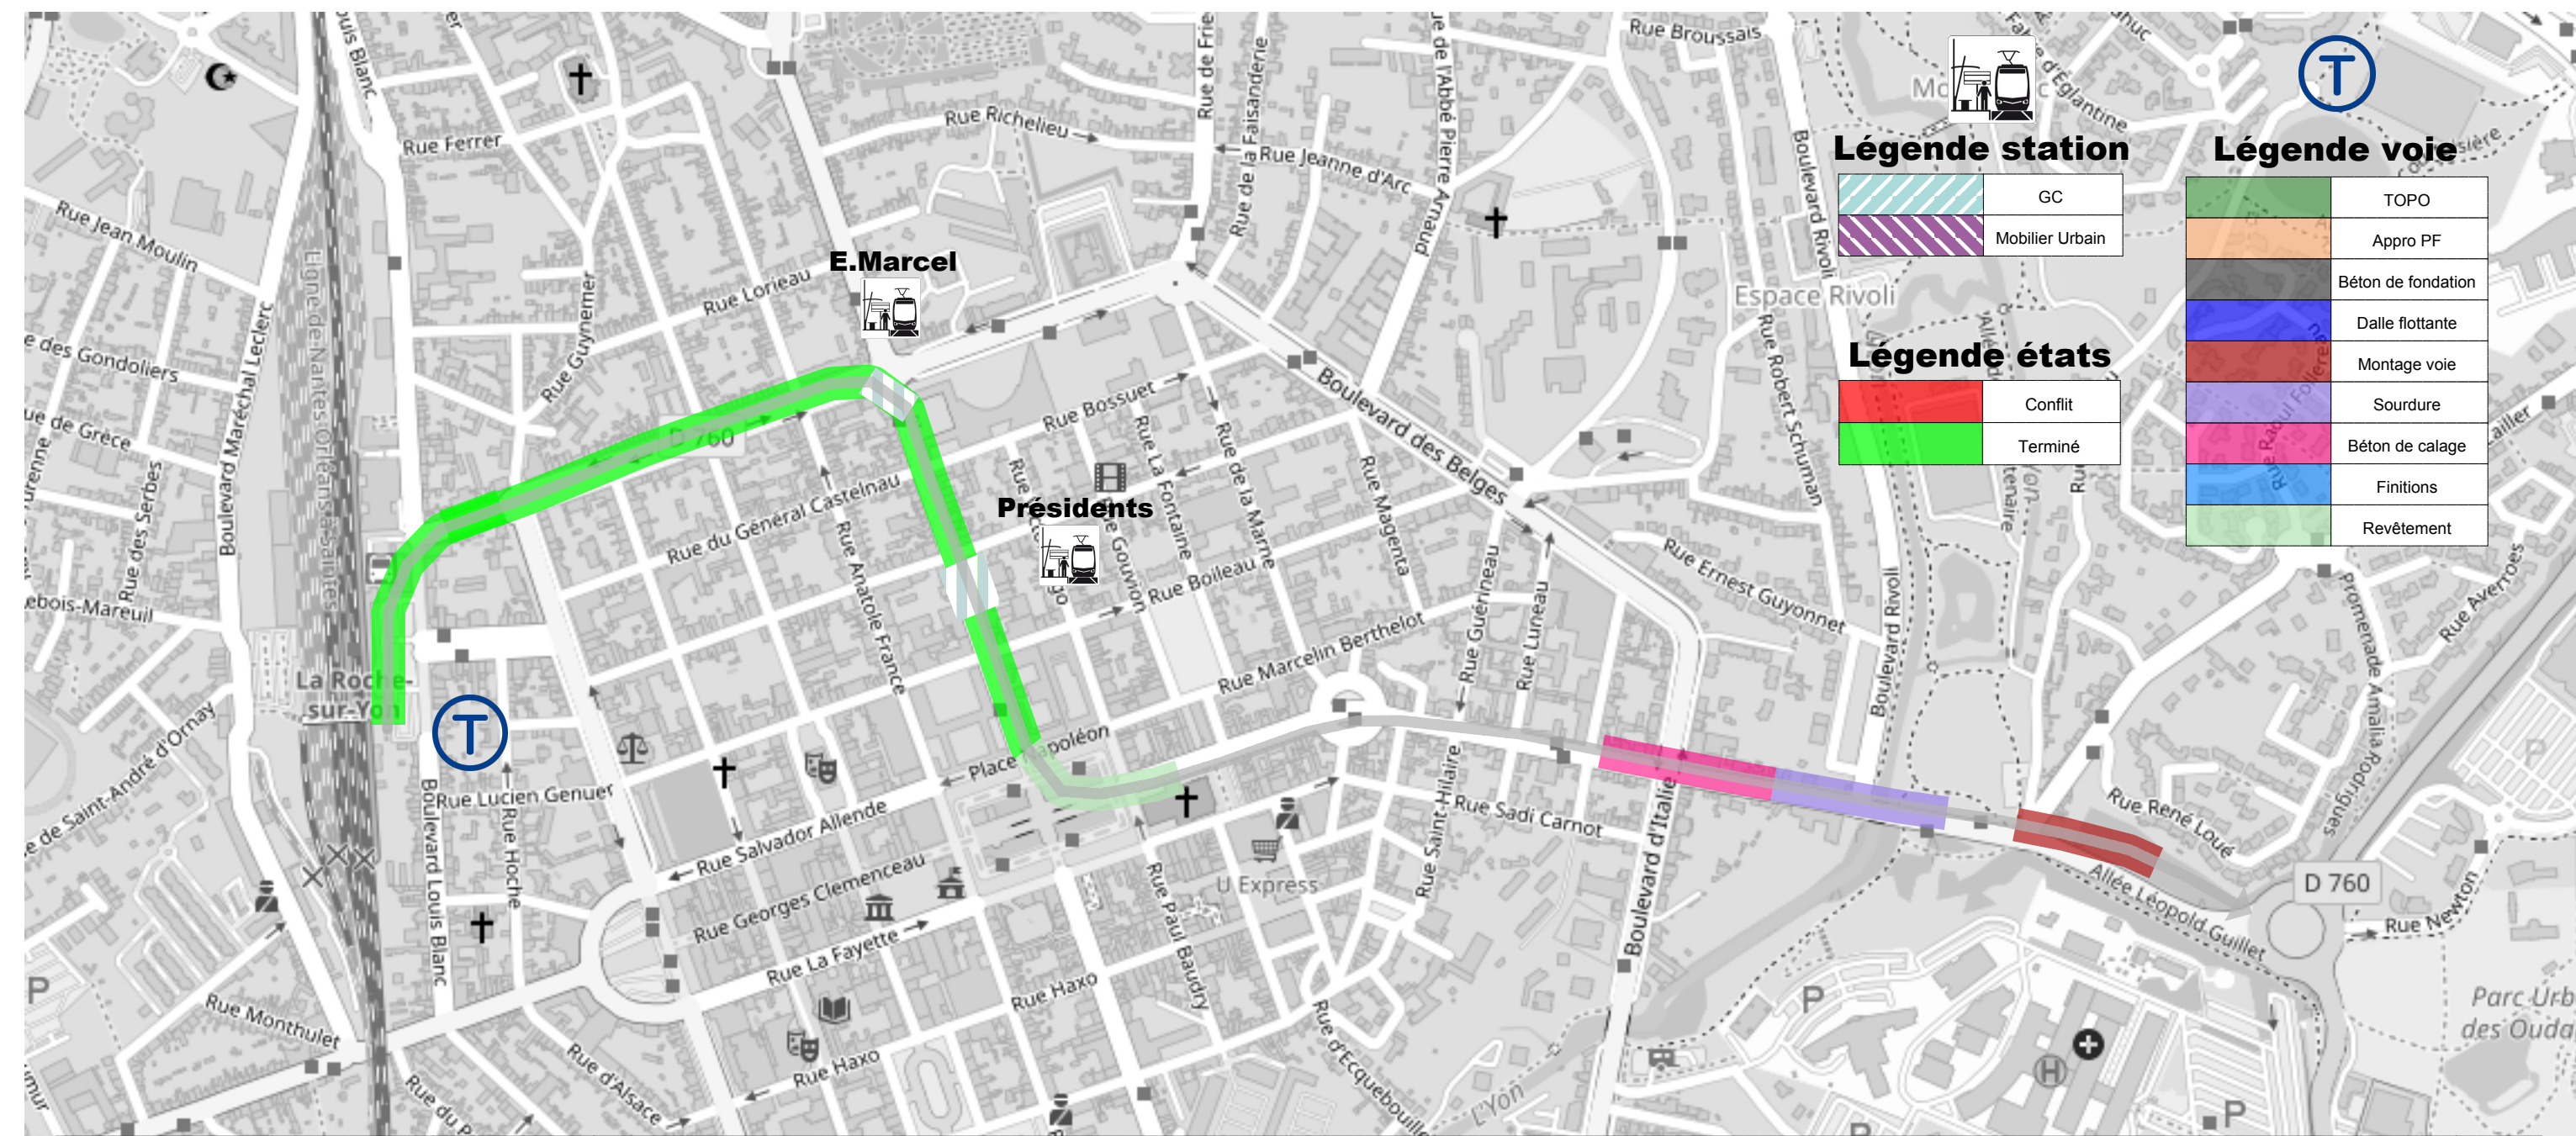

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement


Légende états

	Conflit
	Terminé


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00													
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00													
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20													
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00													
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20													
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20													
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00													
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20													
Station Stade															
Station E.Marcel															
Station Présidents															
Station Maréchal															
Station Liberté															
Station Egalité															
Station Fraternité															

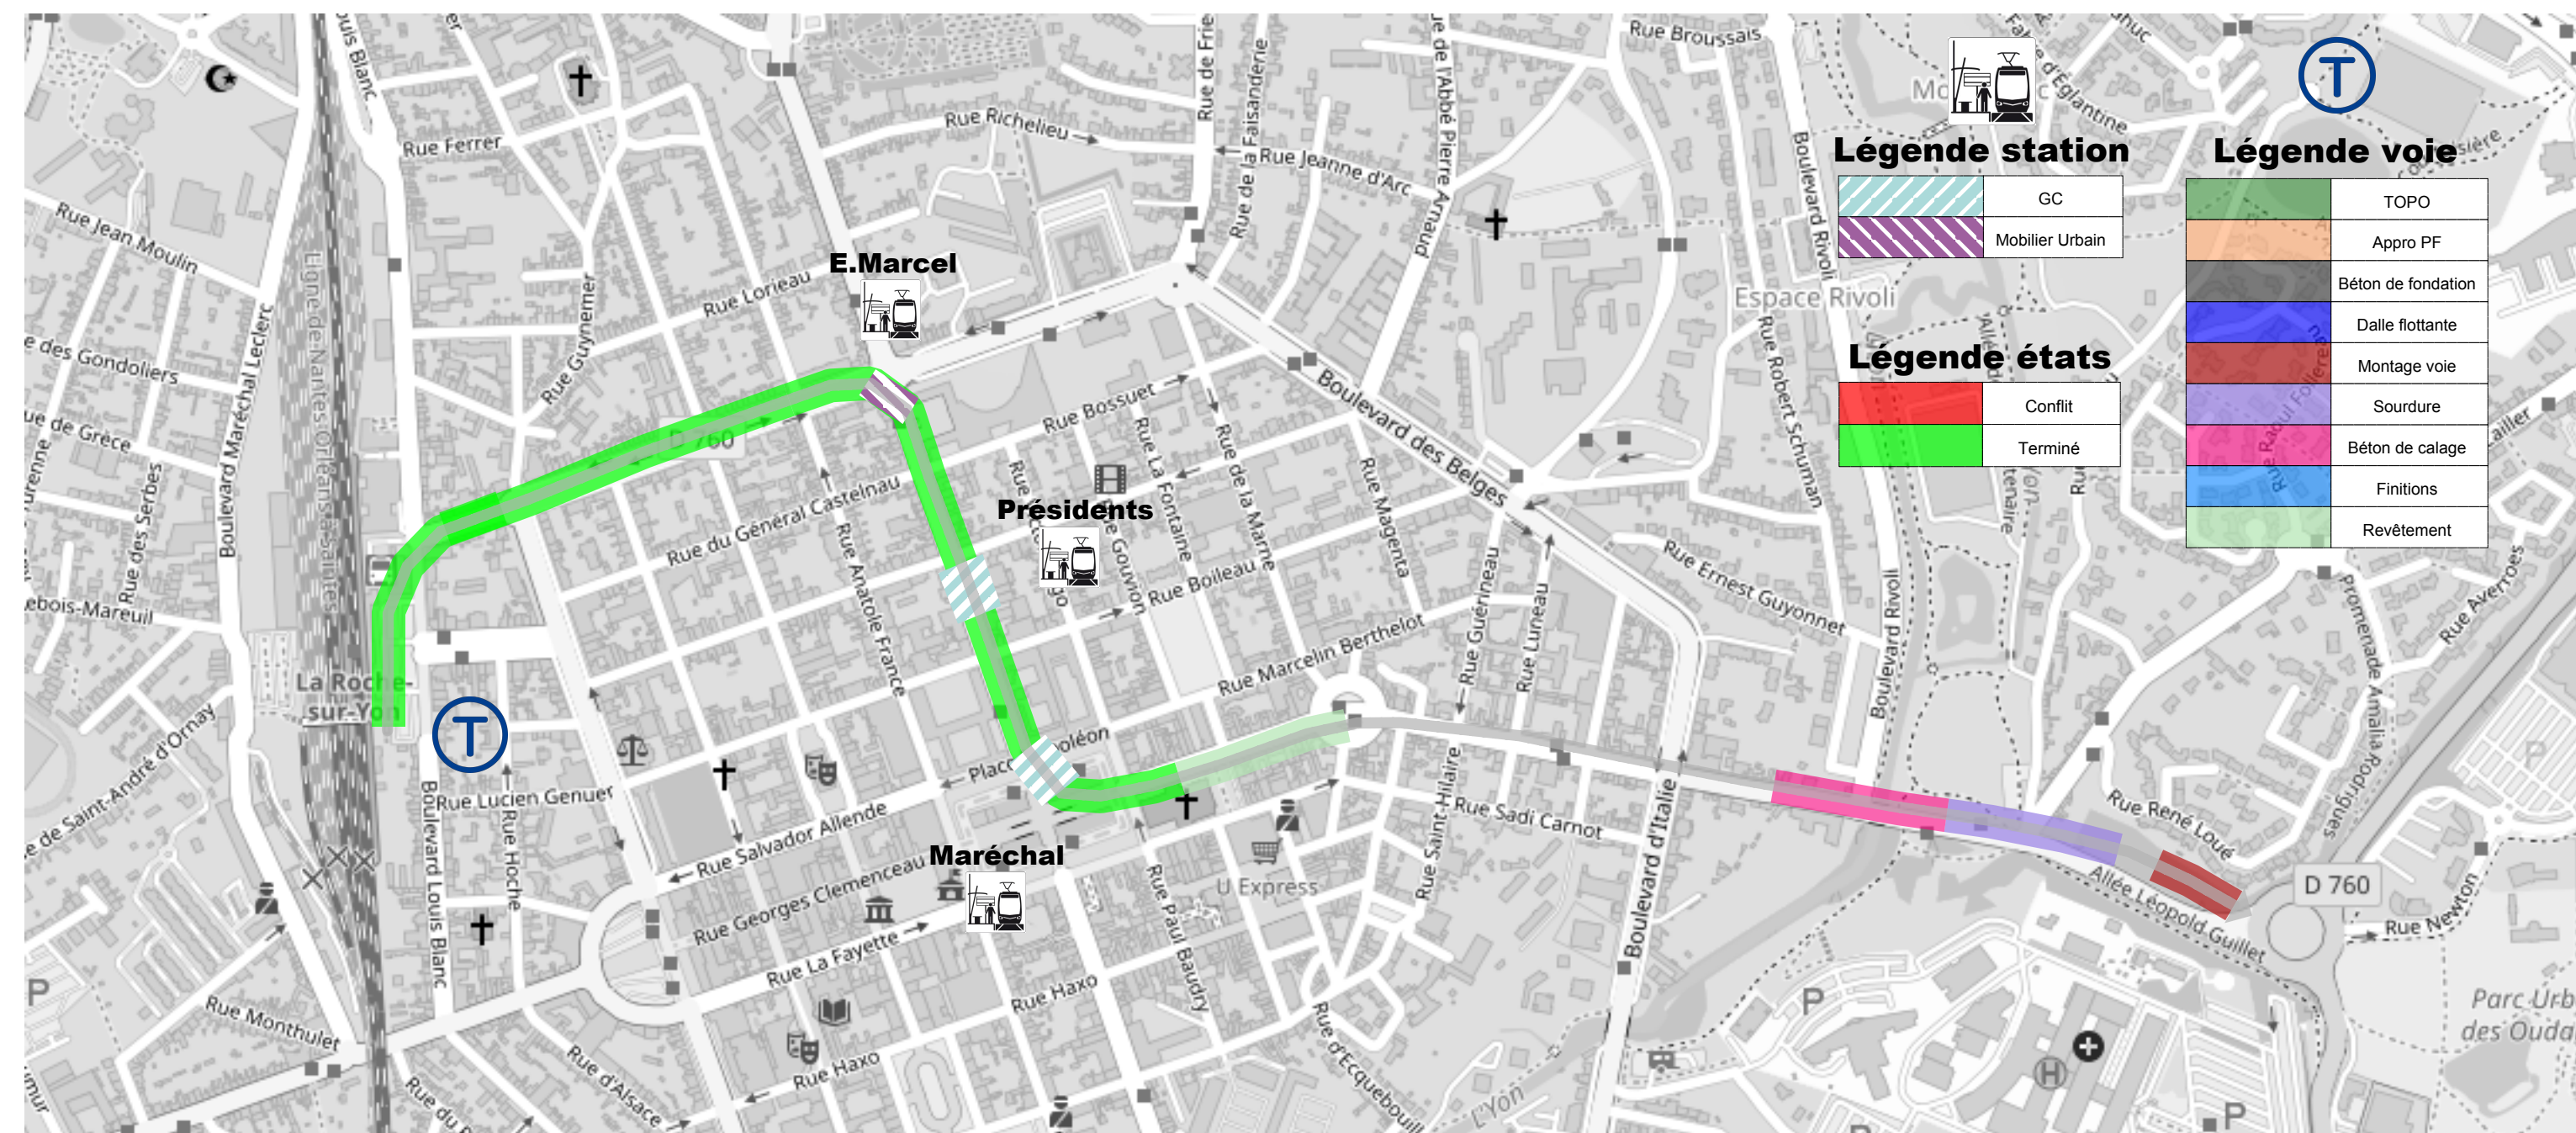

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

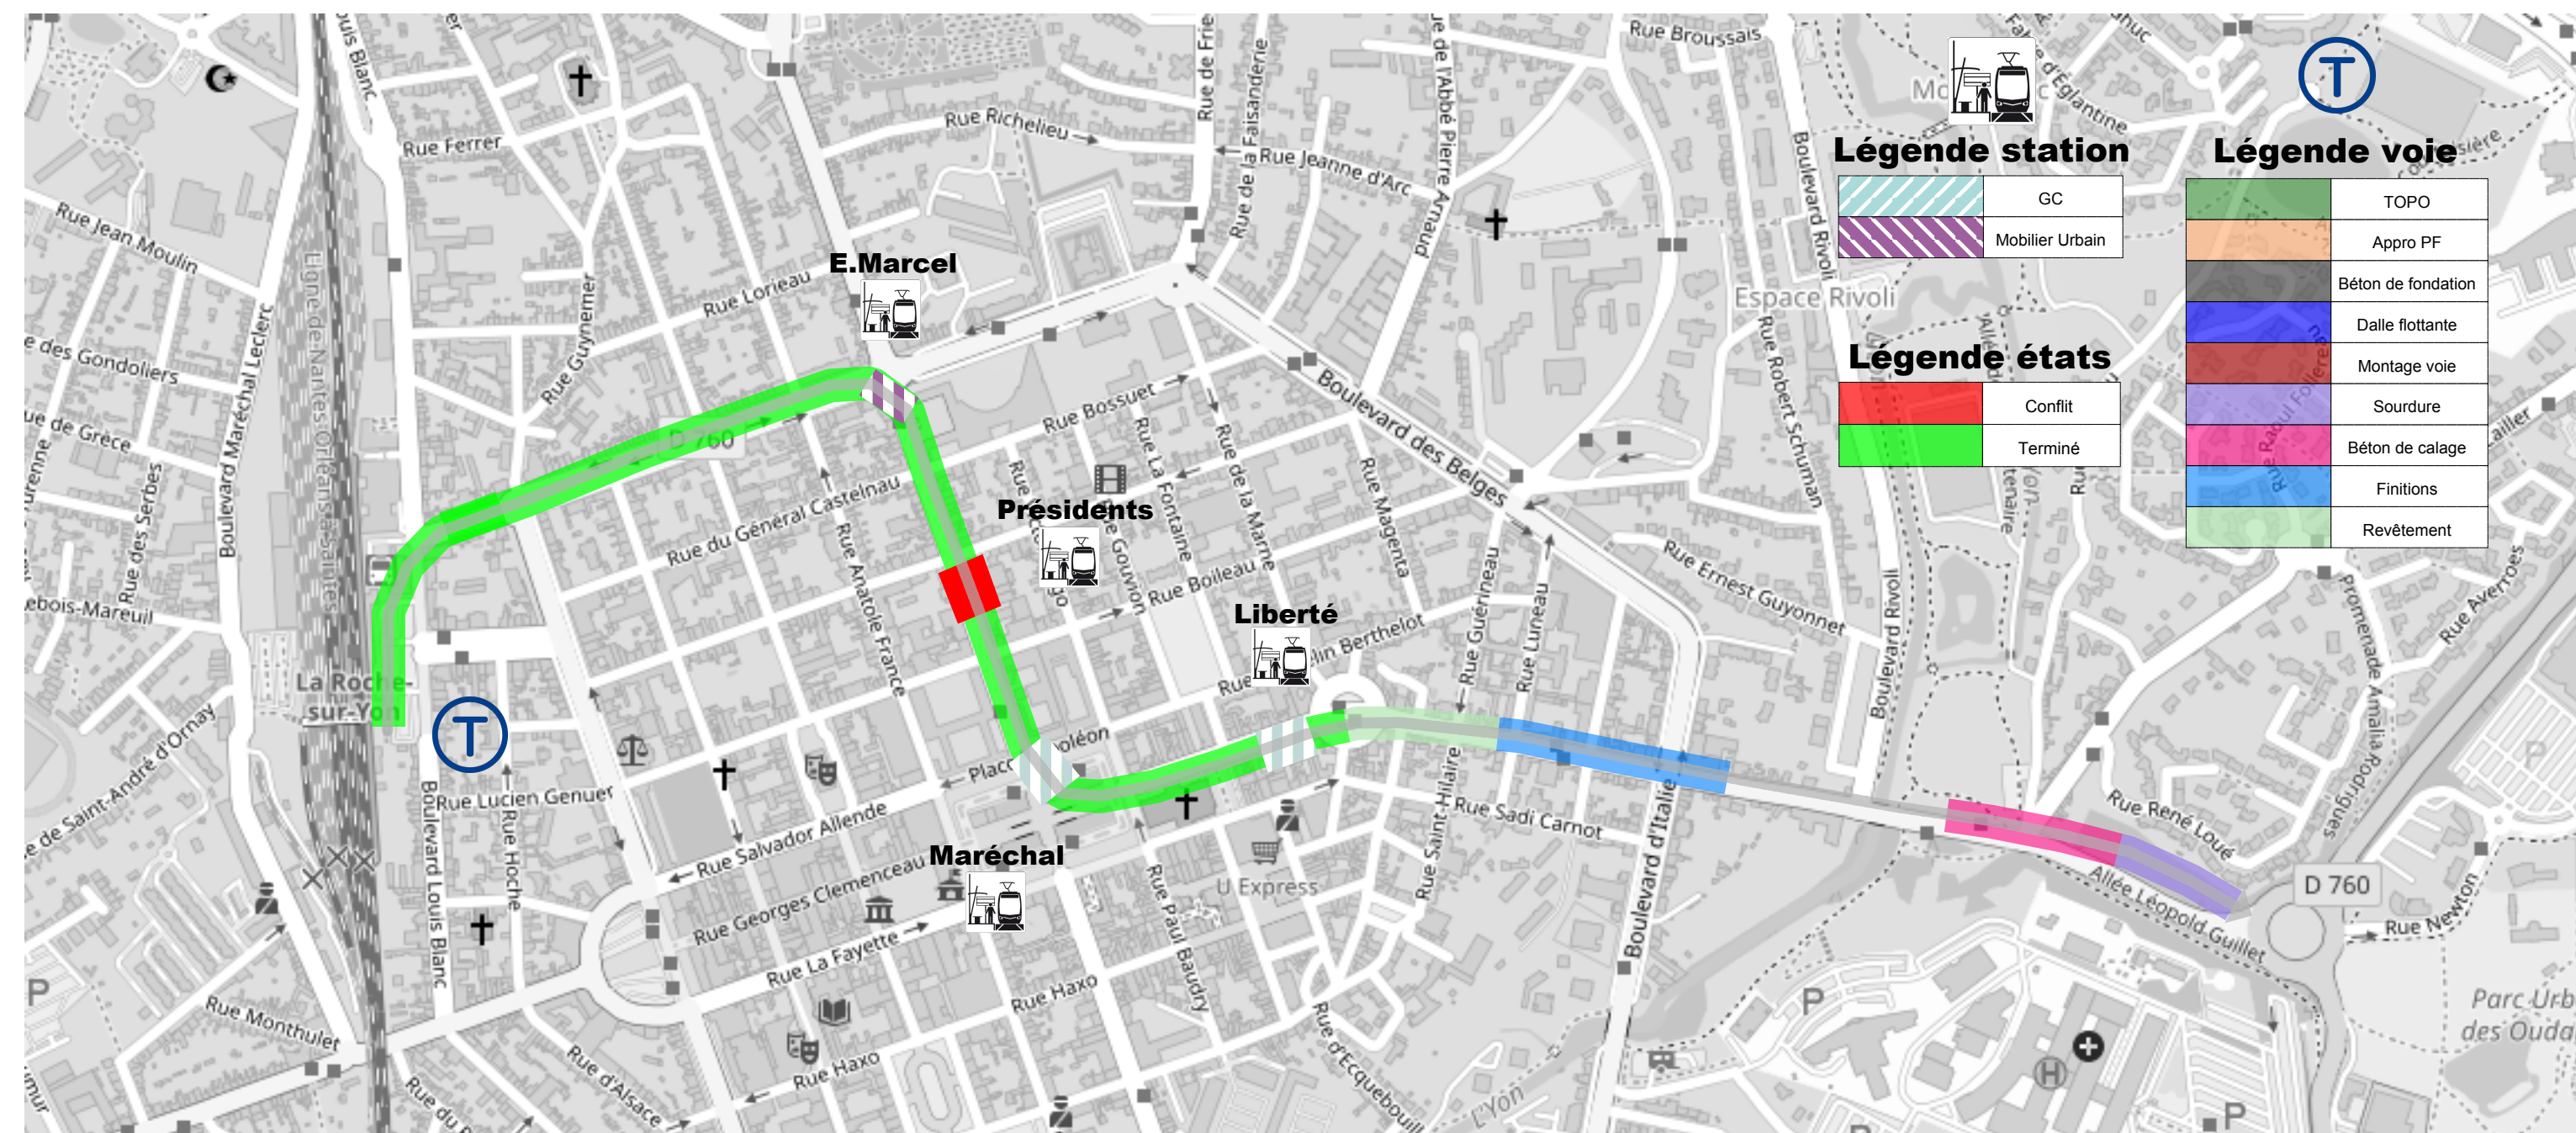

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

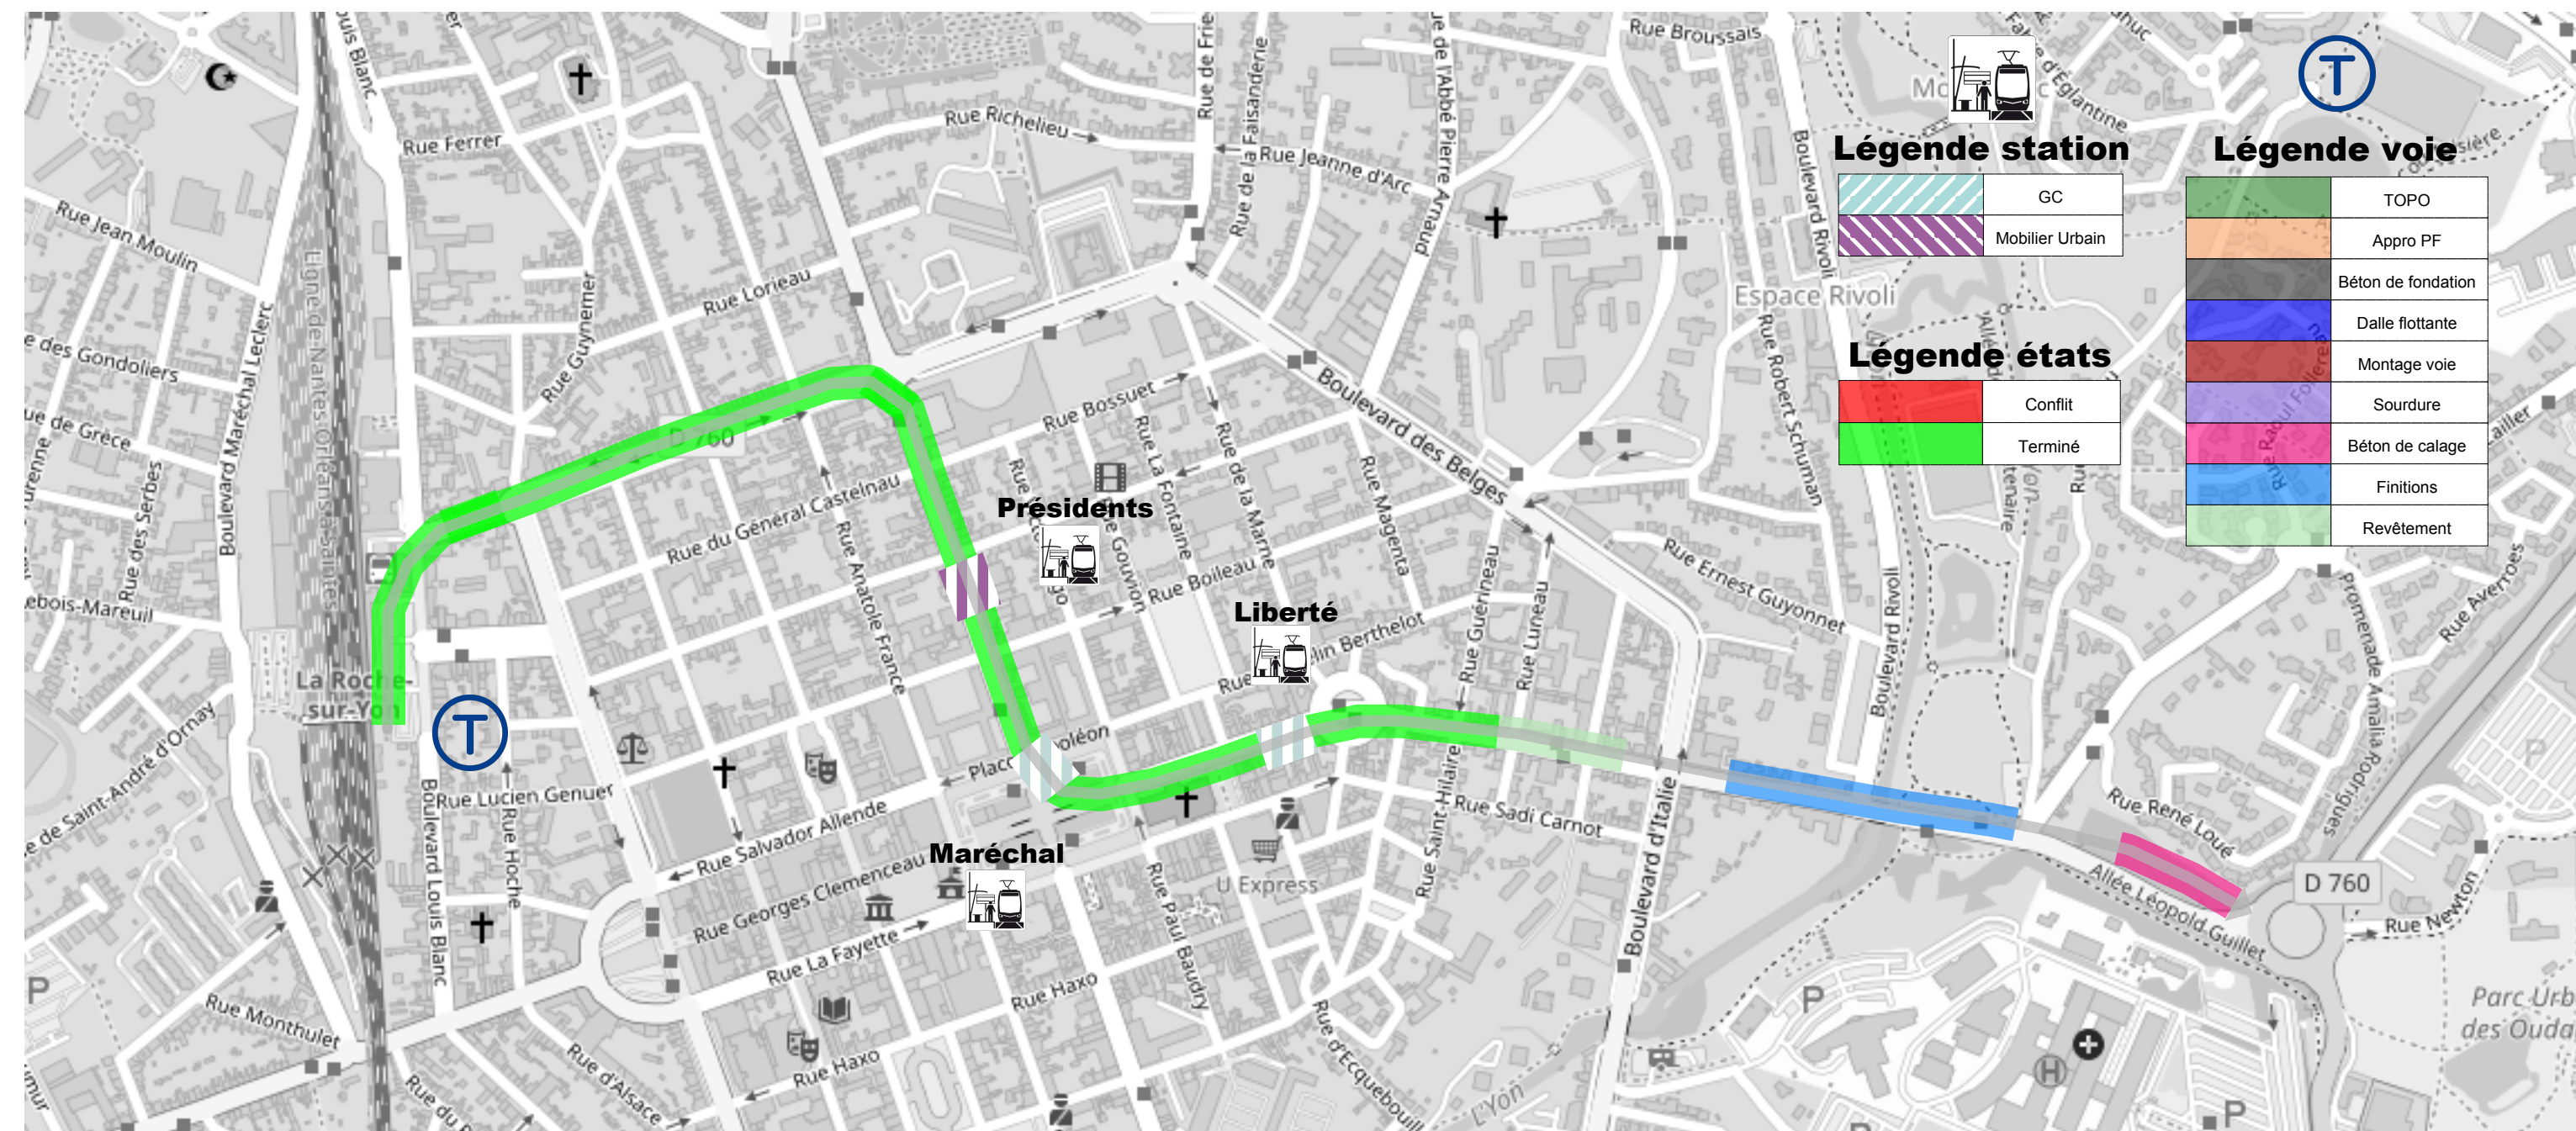

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement

Légende états

	Conflit
	Terminé

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00													
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00													
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20													
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00													
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20													
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20													
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00													
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00													
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20													
Station Stade															
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00													
Station E.Marcel															
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00													
Station Prèsidents															
GC - Prèsidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Prèsidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00													
Station Maréchal															
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00													
Station Liberté															
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00													
Station Egalité															
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00													
Station Fraternité															
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00													

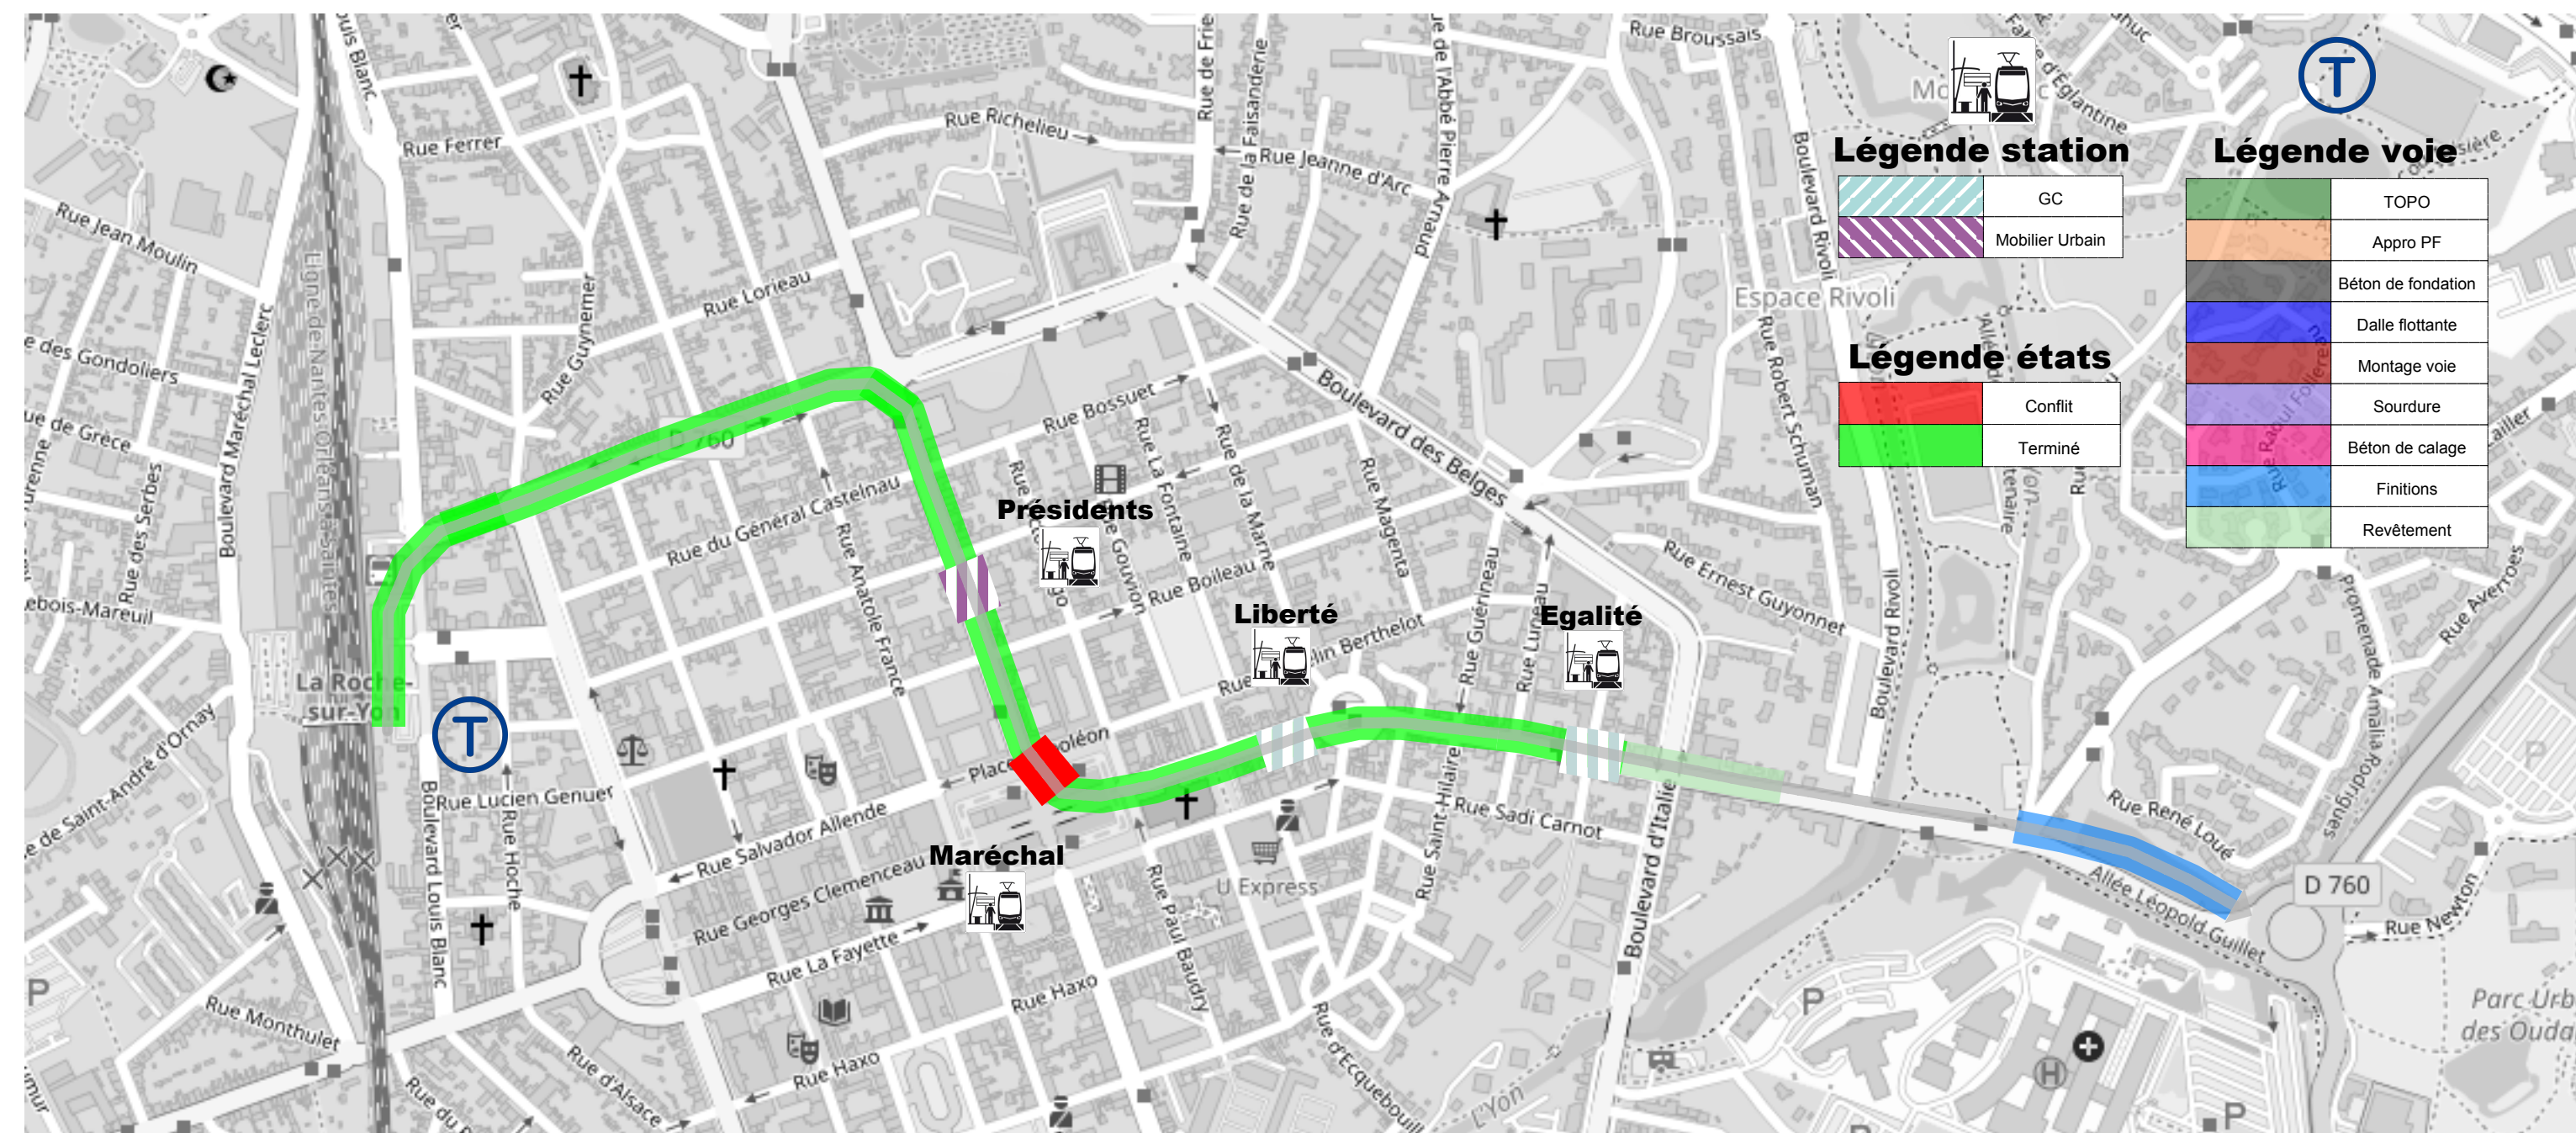

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement


Légende états

	Conflit
	Terminé

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020	
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier					
Voies Tramway			Voies Tramway													
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00														
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00														
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20														
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00														
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20														
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20														
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00														
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20														
Station Stade																
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00														
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00														
Station E.Marcel																
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00														
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00														
Station Présidents																
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00														
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00														
Station Maréchal																
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00														
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00														
Station Liberté																
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00														
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00														
Station Egalité																
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00														
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00														
Station Fraternité																
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00														
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00														

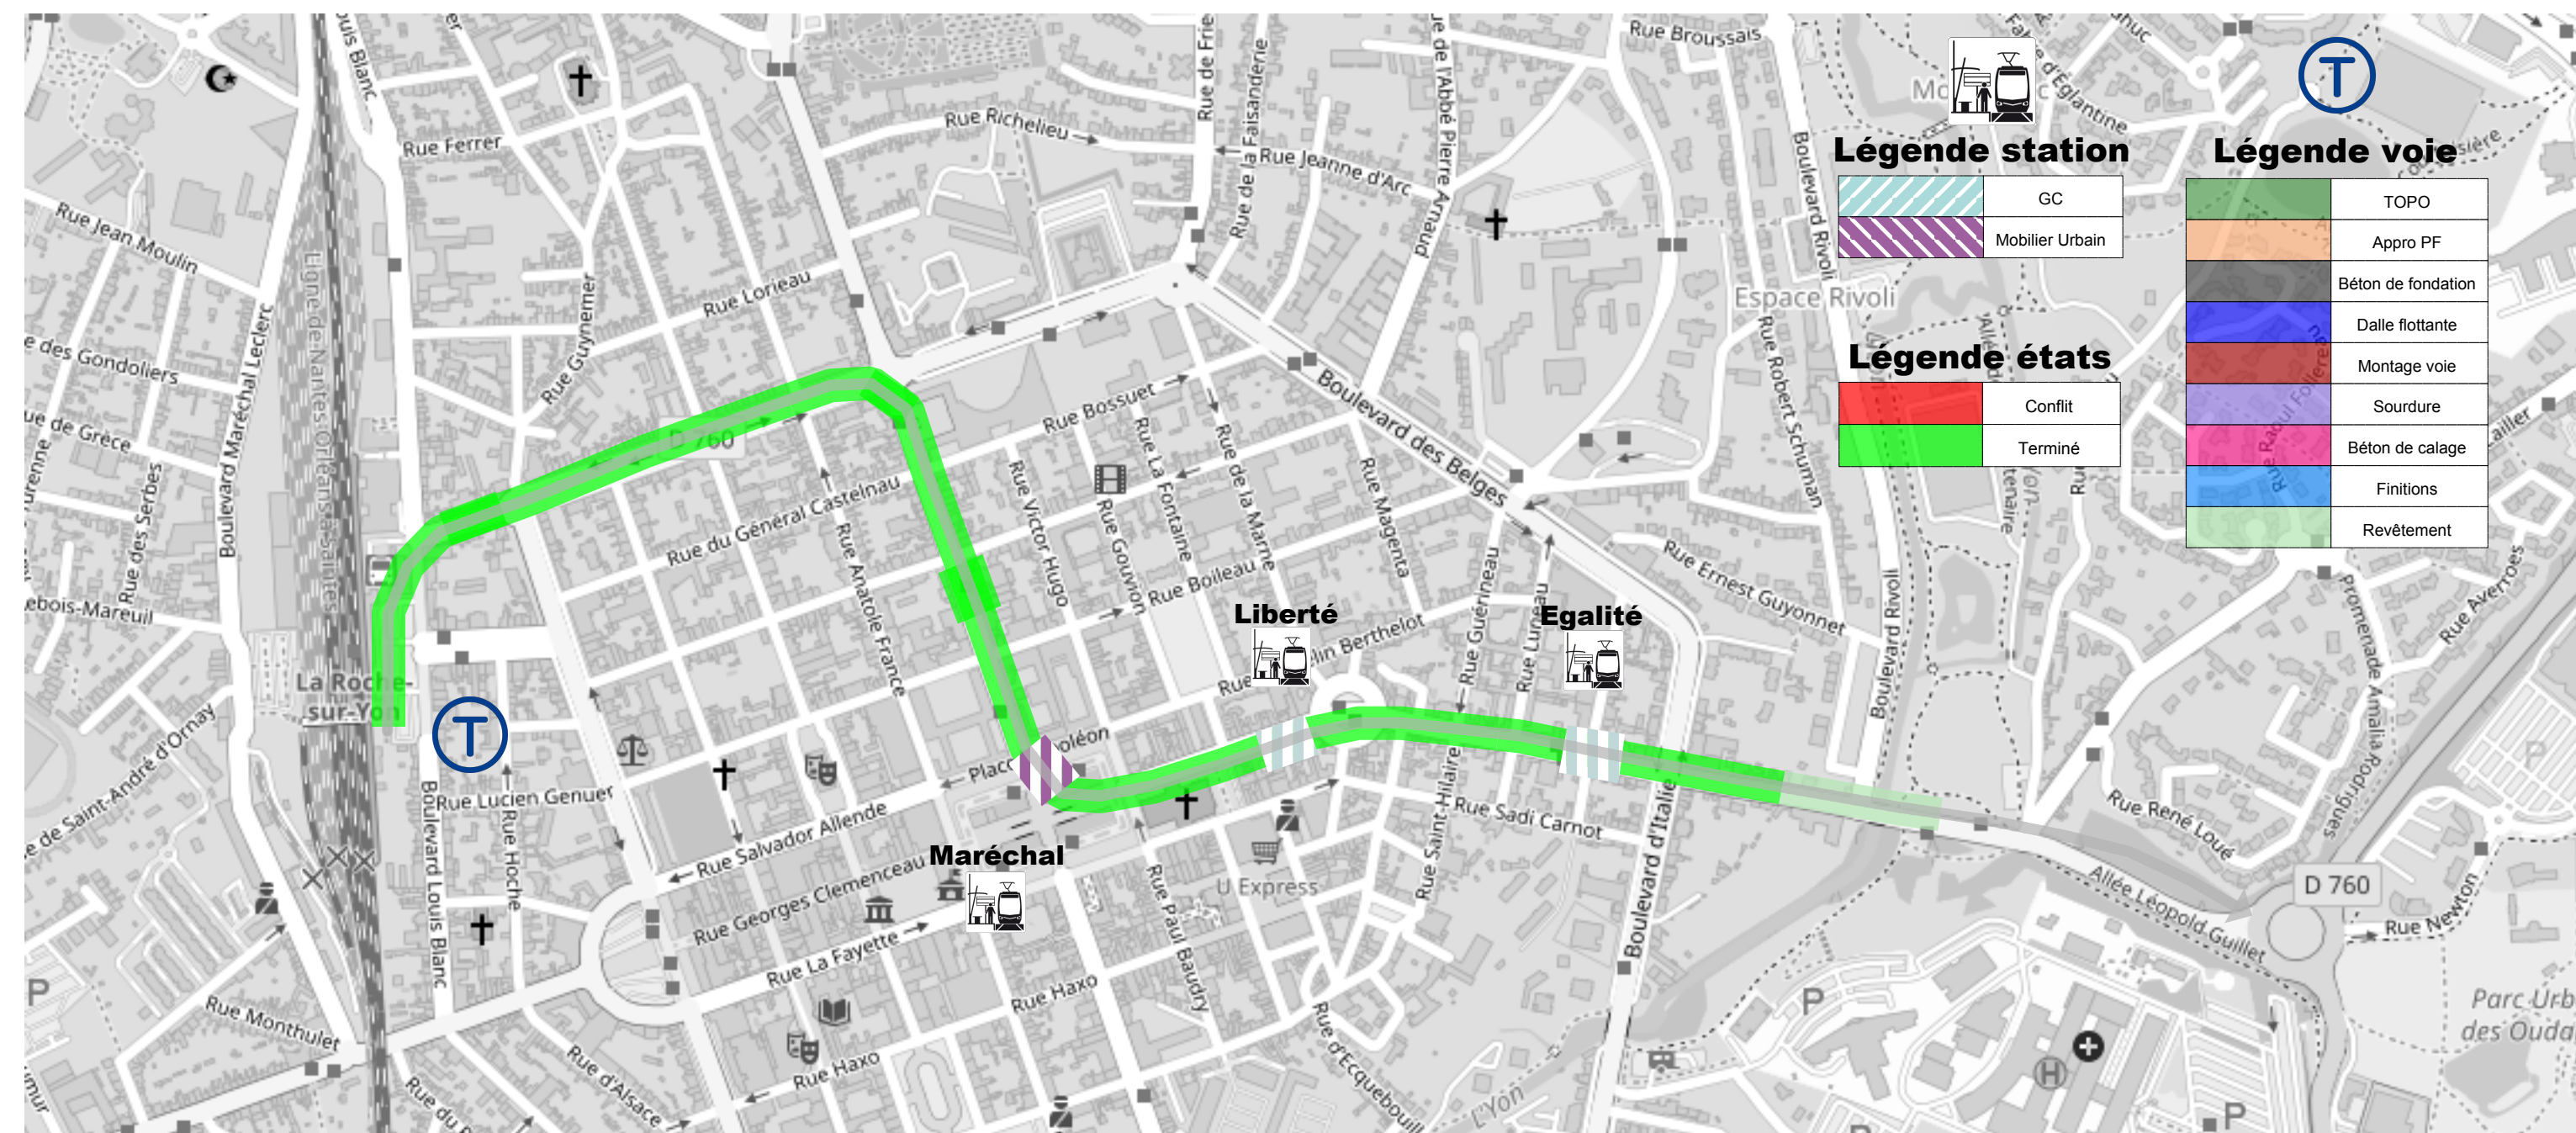

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
Montage voie	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	Montage voie												
Appro PF	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Appro PF												
Soudure	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Soudure												
Béton de fondation	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Béton de fondation												
Béton de calage	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de calage												
Dalle flottante	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Dalle flottante												
Montage voie	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Revêtement												
Soudure	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de fondation												
Finitions	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Finitions												
Montage voie	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Revêtement												
Soudure	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Béton de calage												
Béton de fondation	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

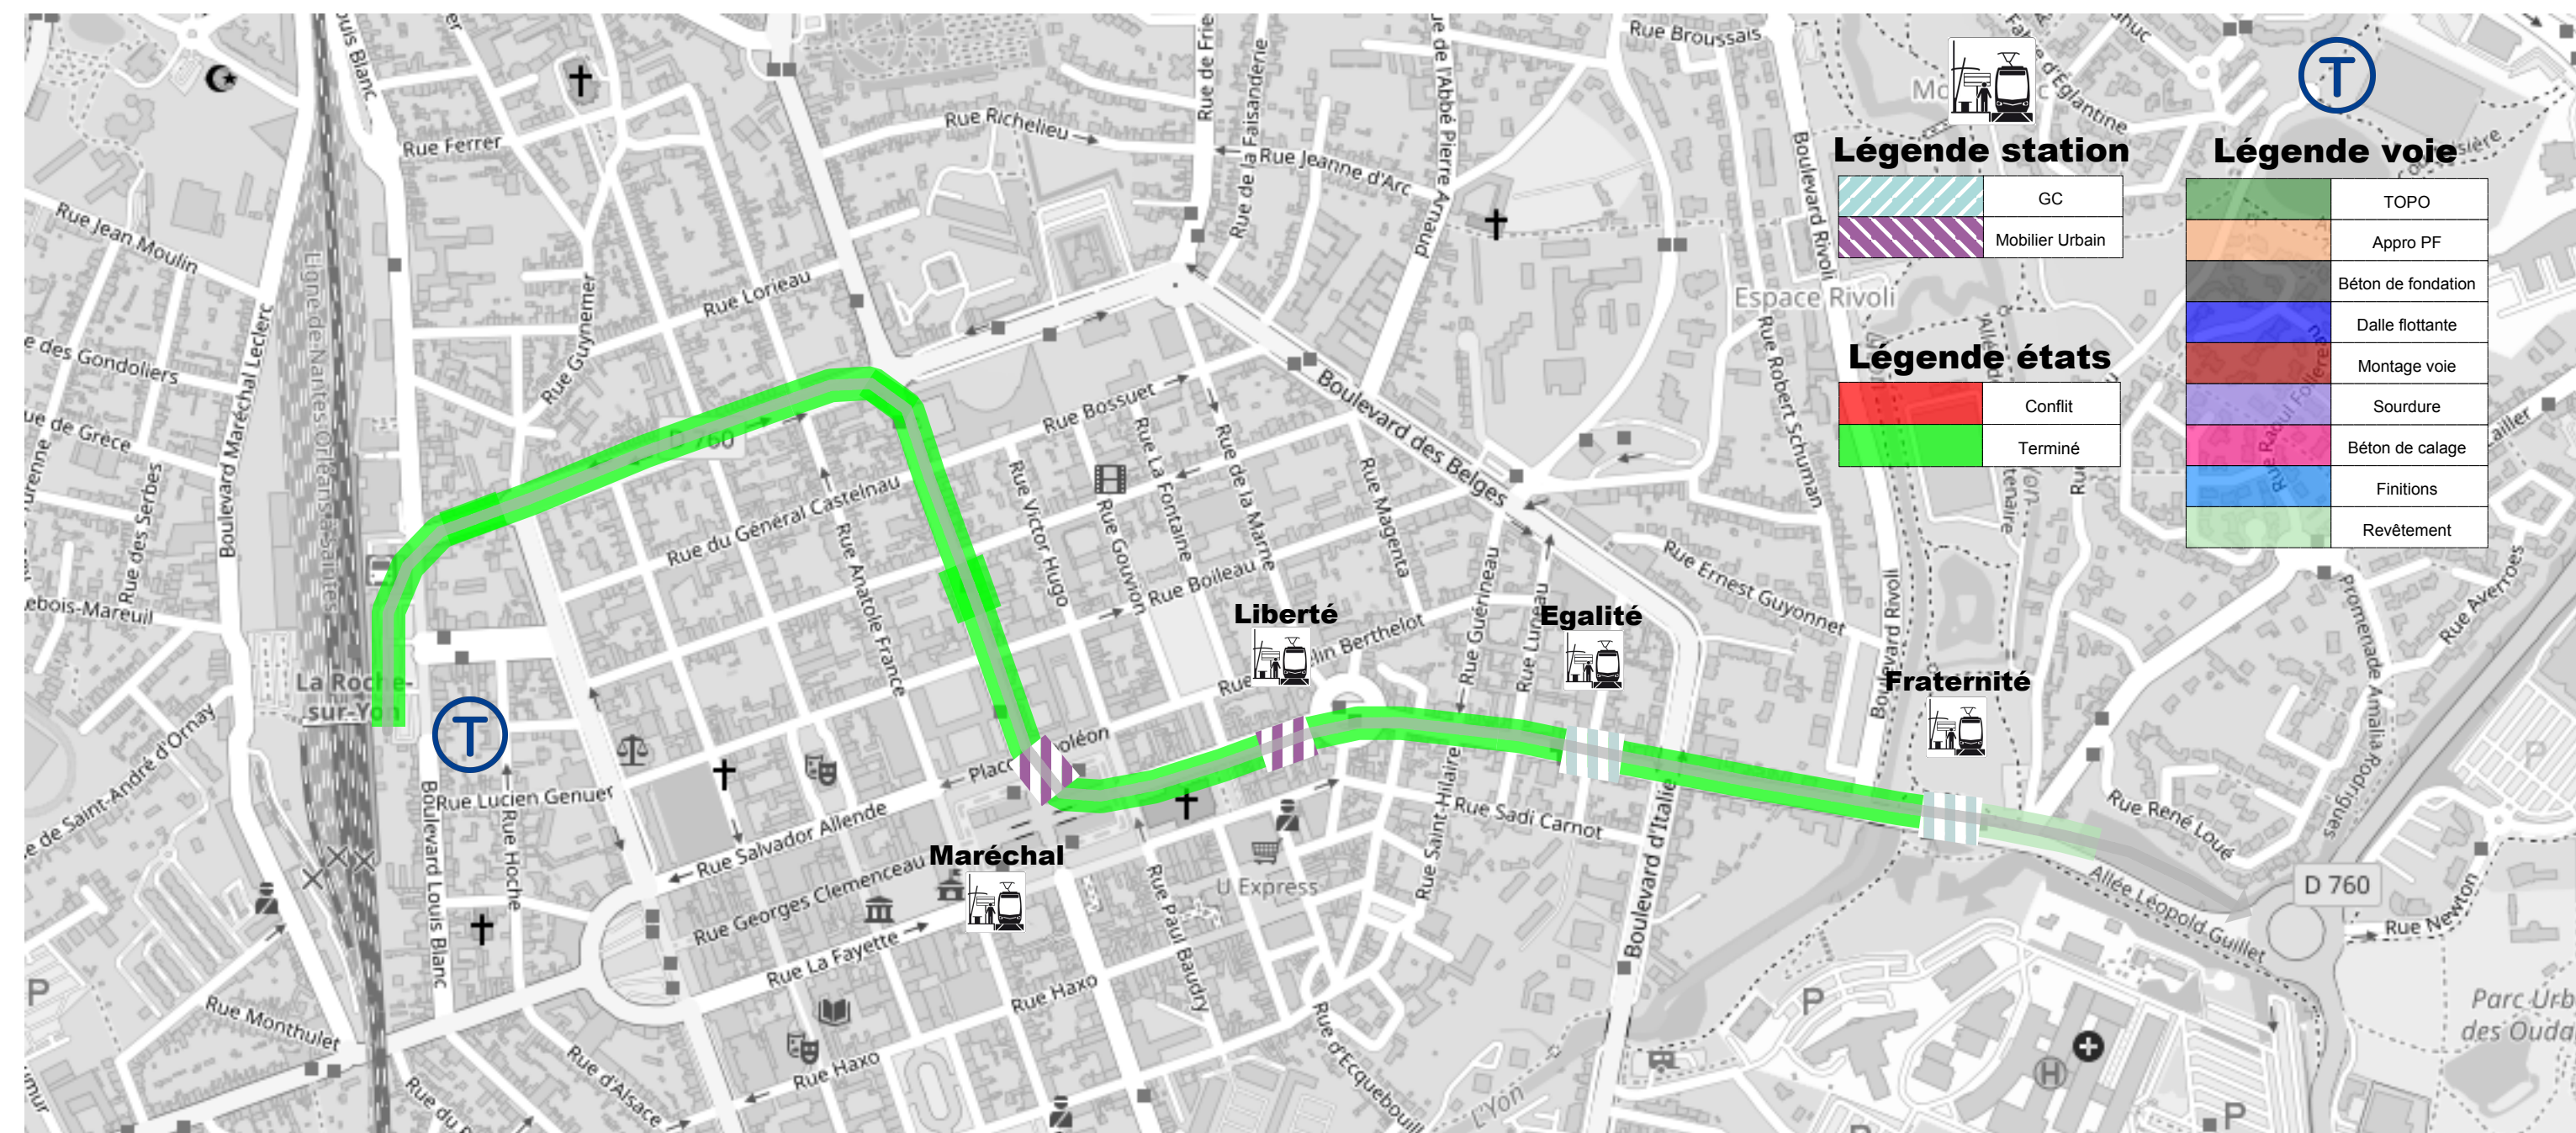

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement


Légende états

	Conflit
	Terminé


Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00													
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00													
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20													
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00													
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20													
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20													
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00													
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20													
Station Stade															
Station E.Marcel															
Station Présidents															
Station Maréchal															
Station Liberté															
Station Egalité															
Station Fraternité															

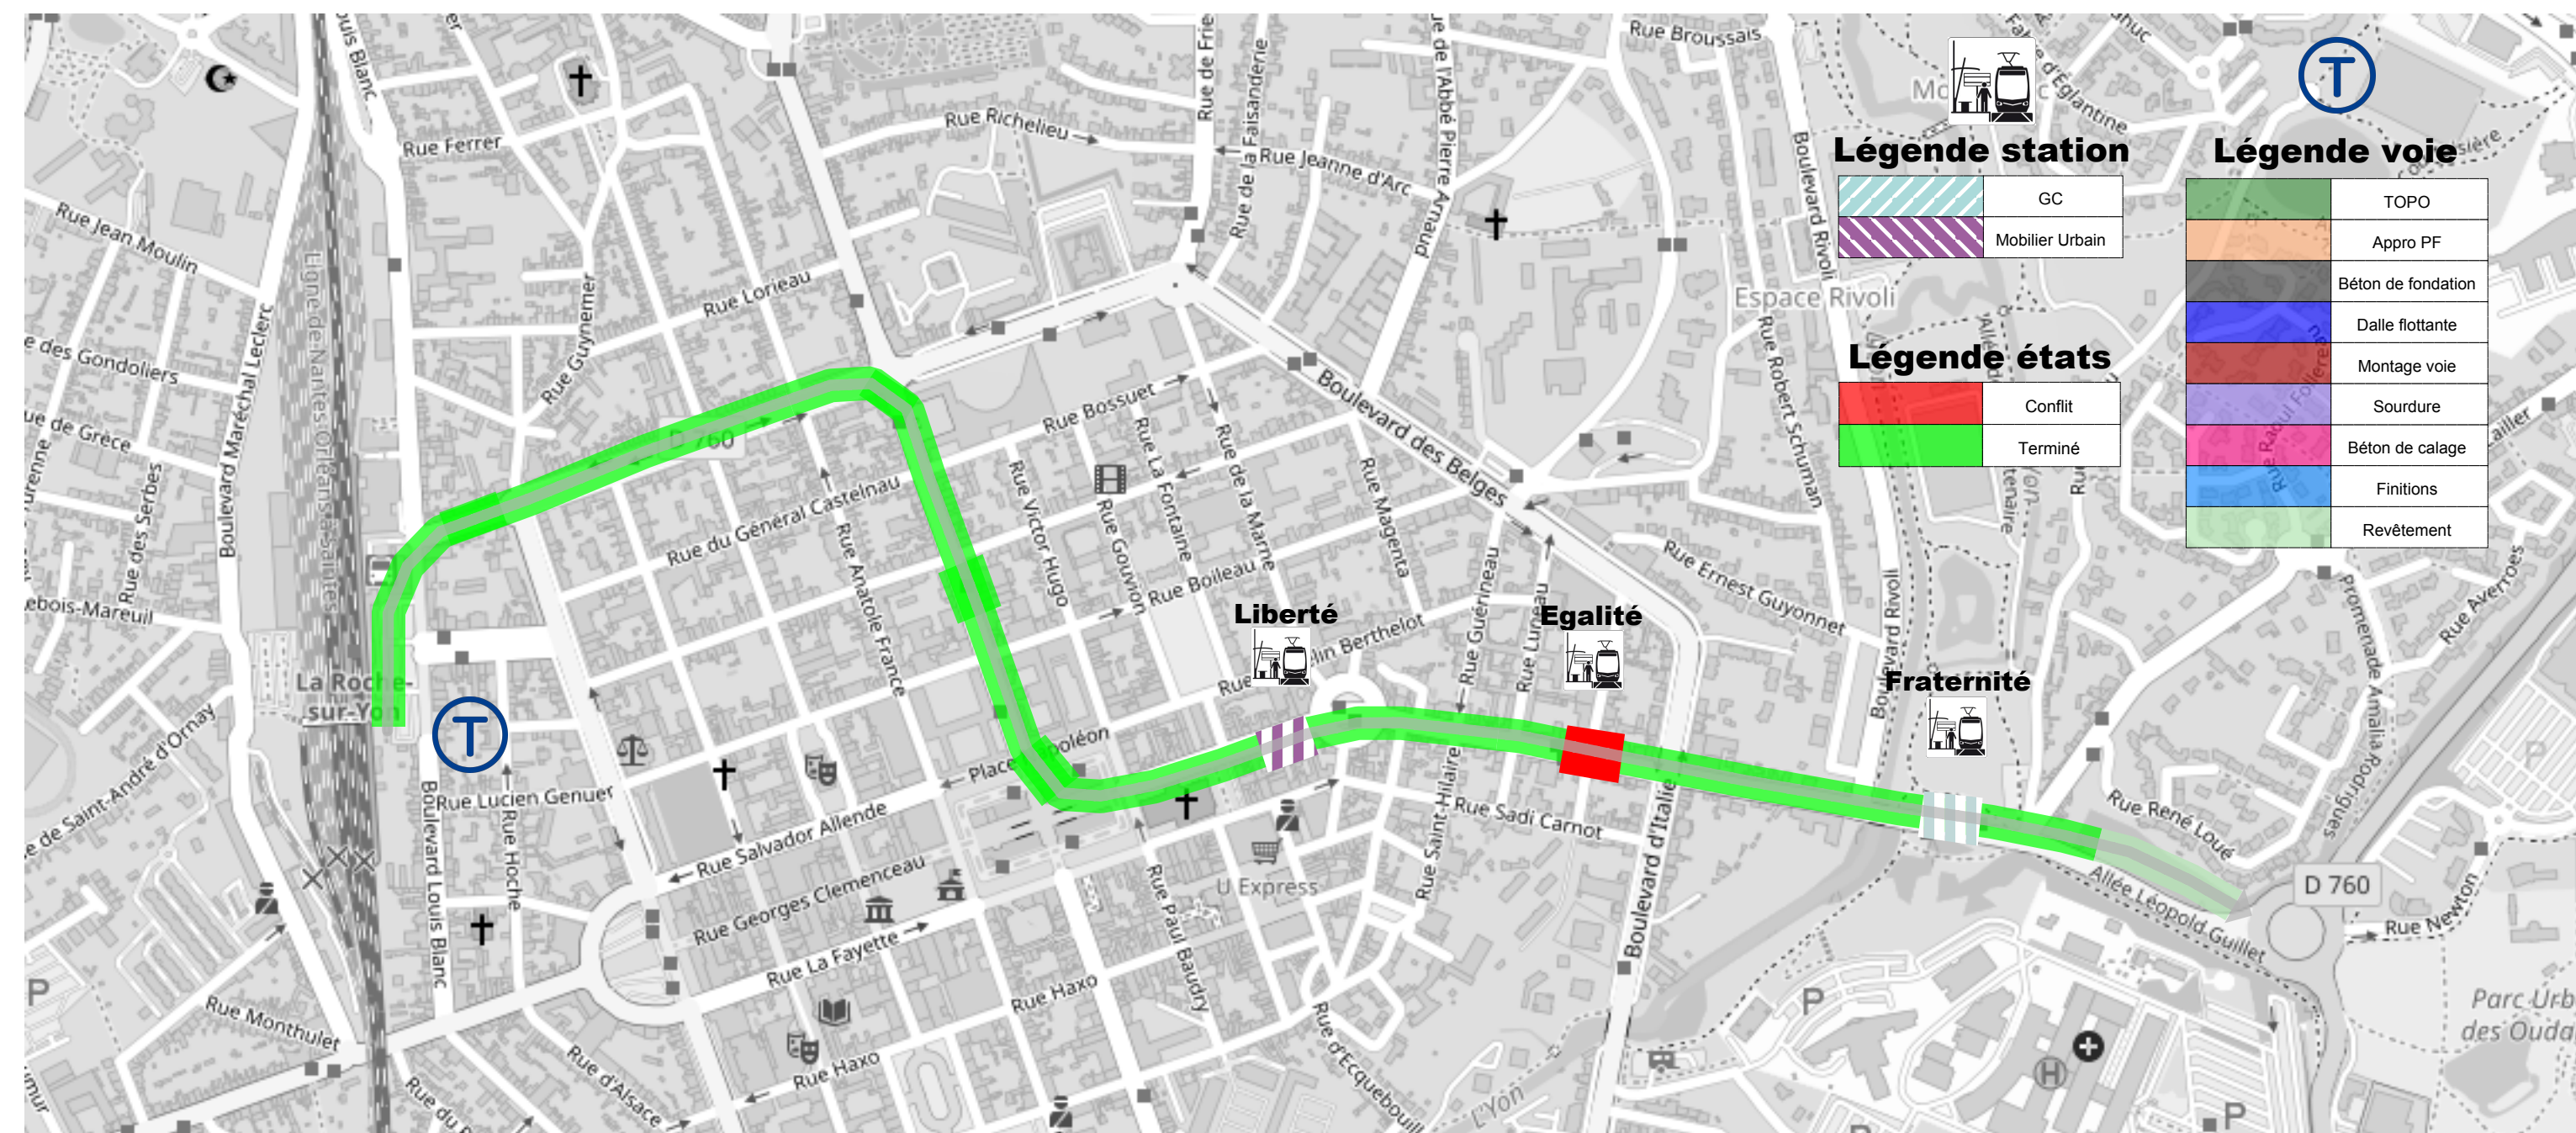

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

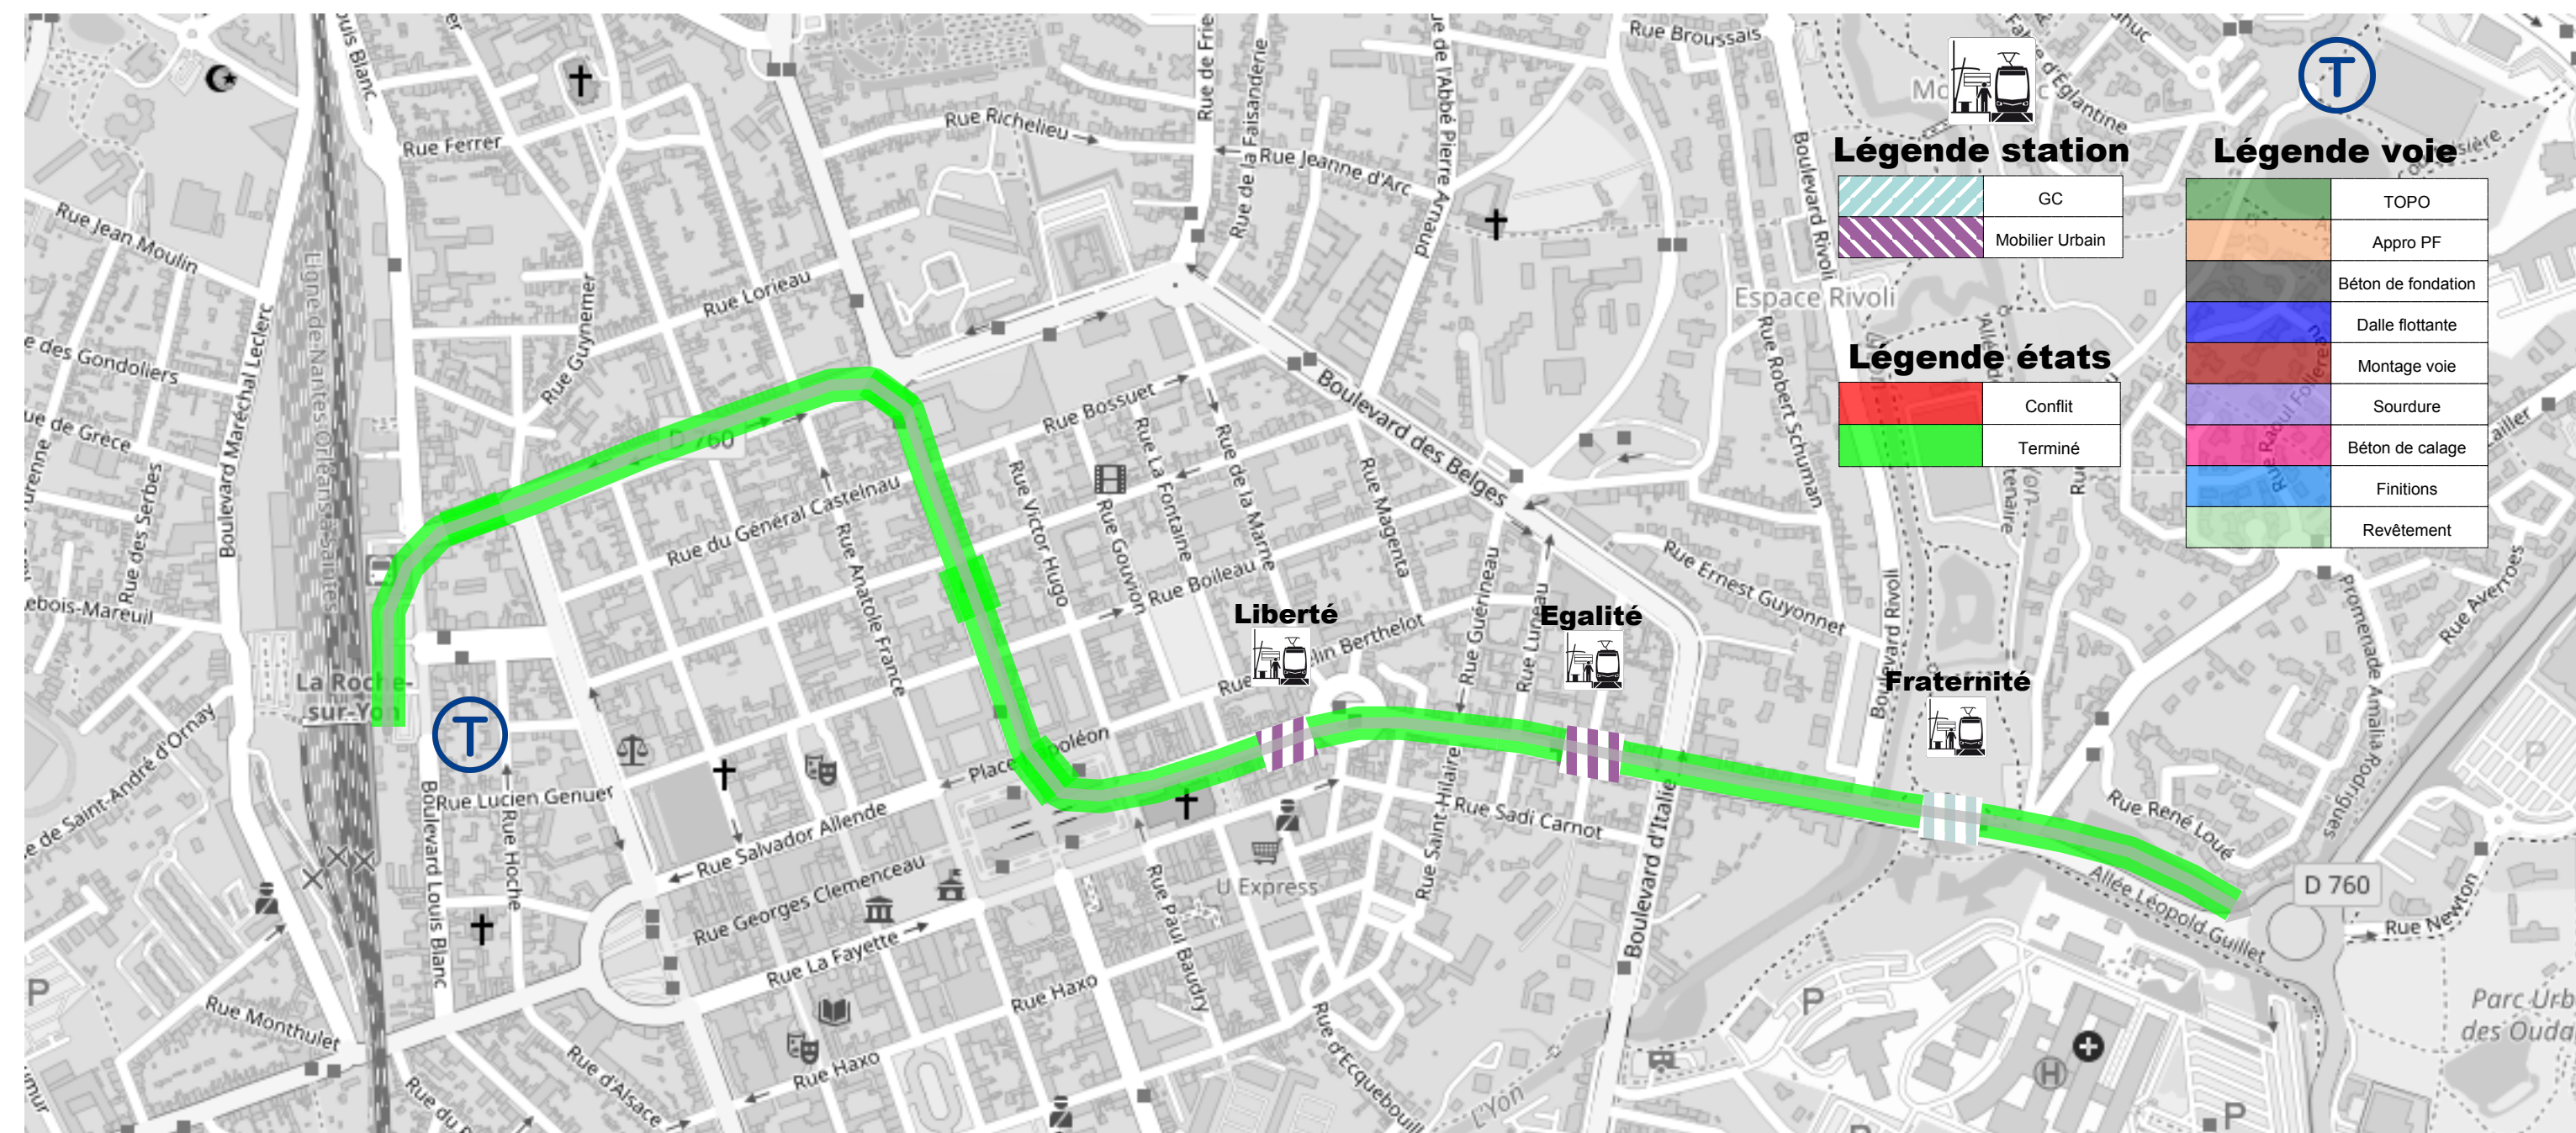

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

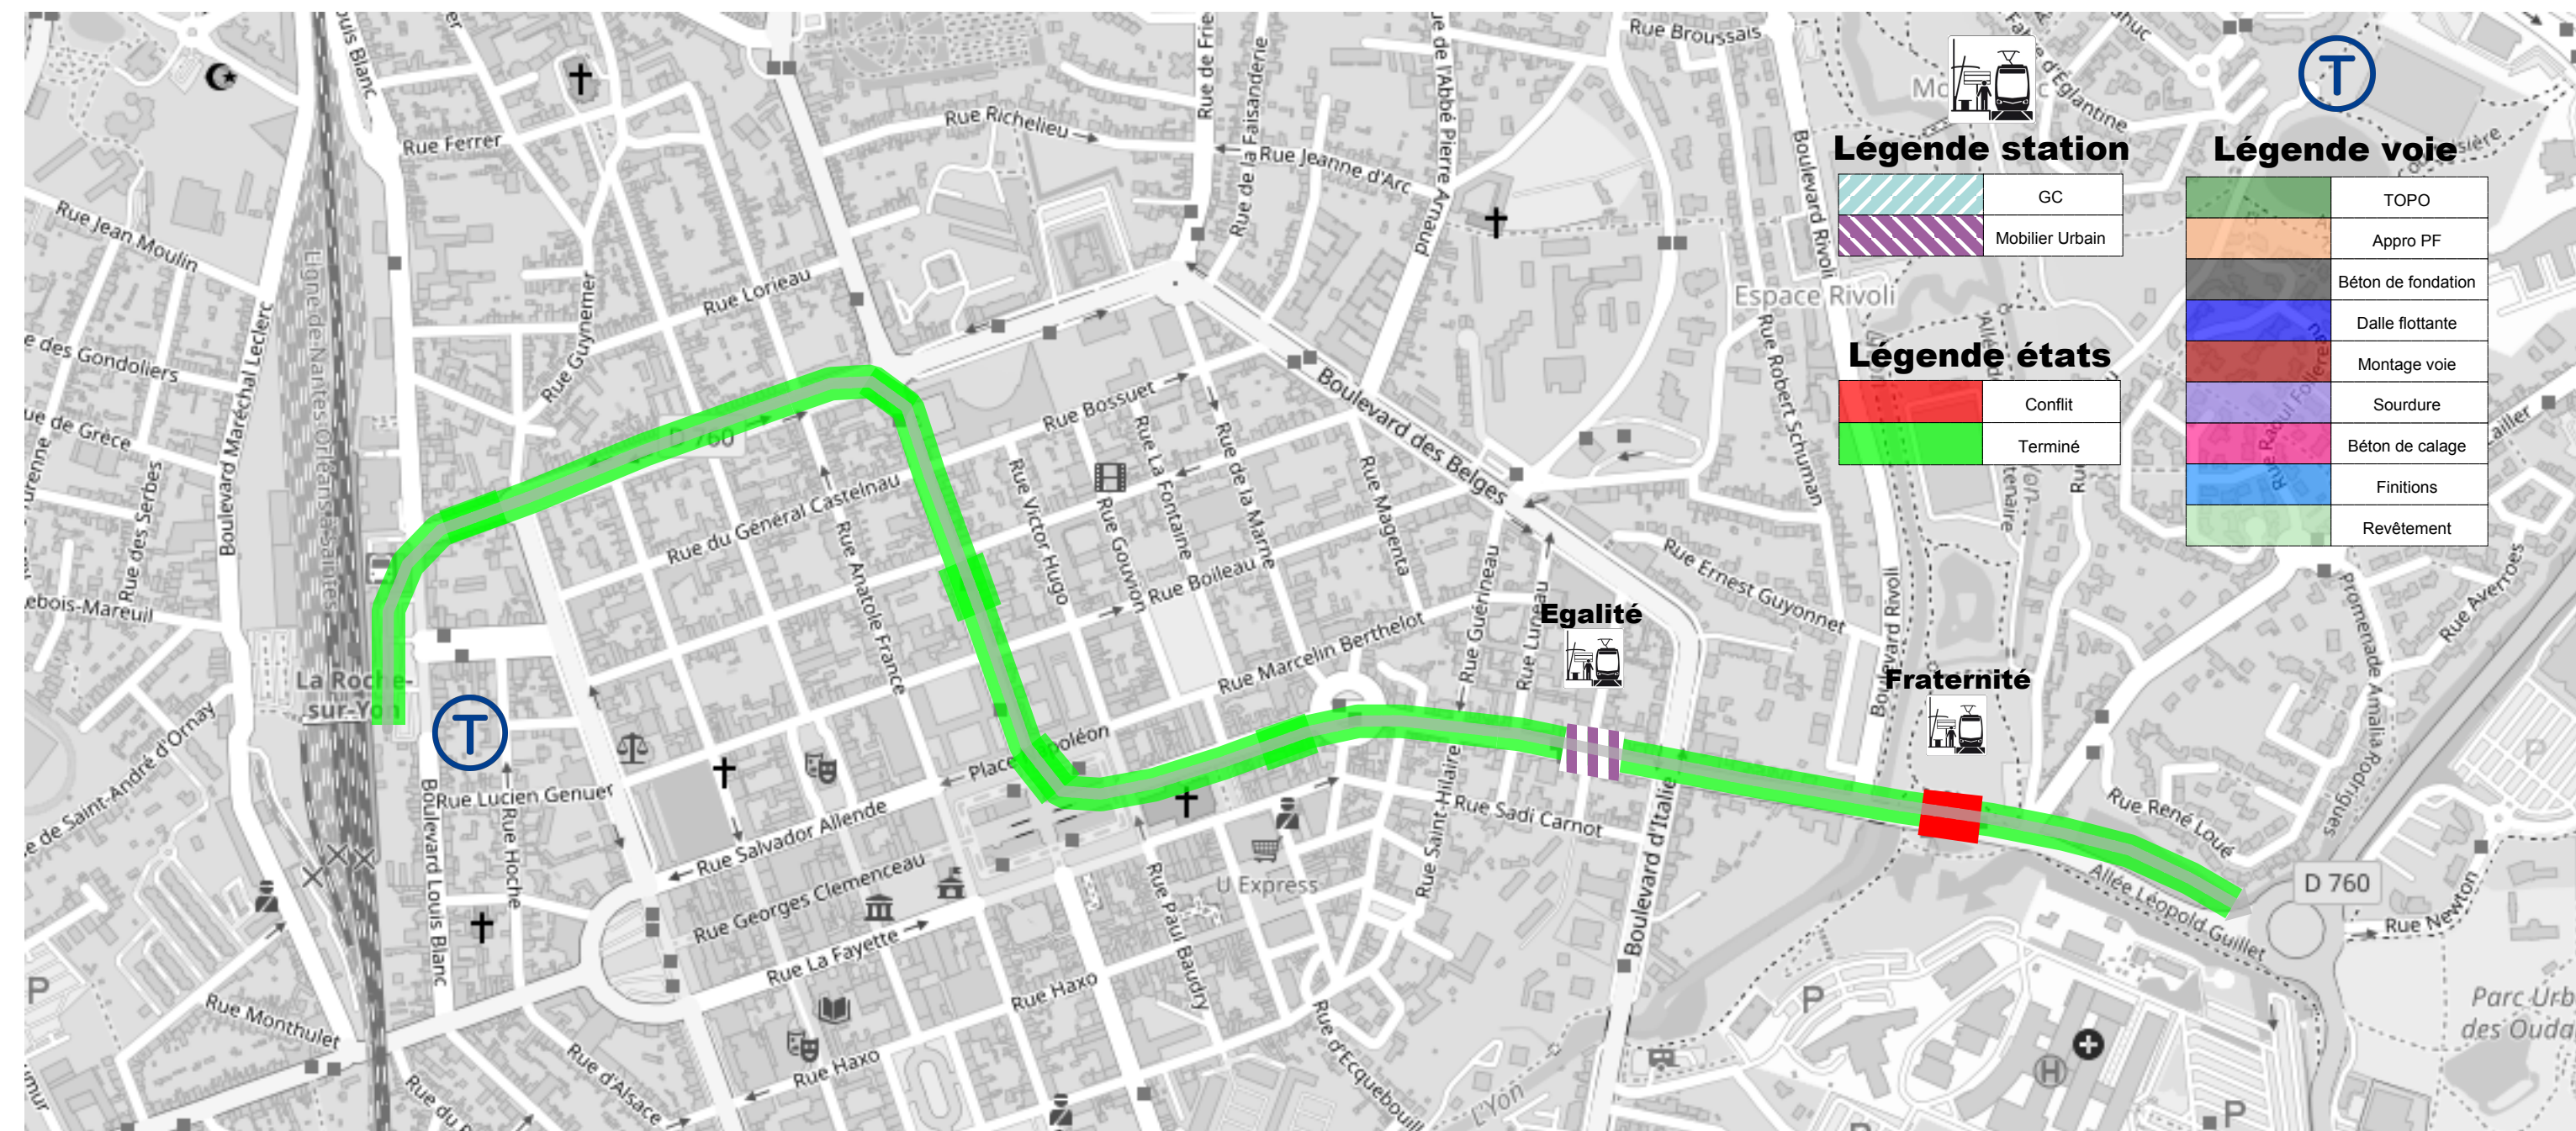

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement

Légende états

	Conflit
	Terminé

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00													
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00													
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20													
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00													
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20													
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20													
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00													
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20													
Station Stade															
Station E.Marcel															
Station Présidents															
Station Maréchal															
Station Liberté															
Station Egalité															
Station Fraternité															

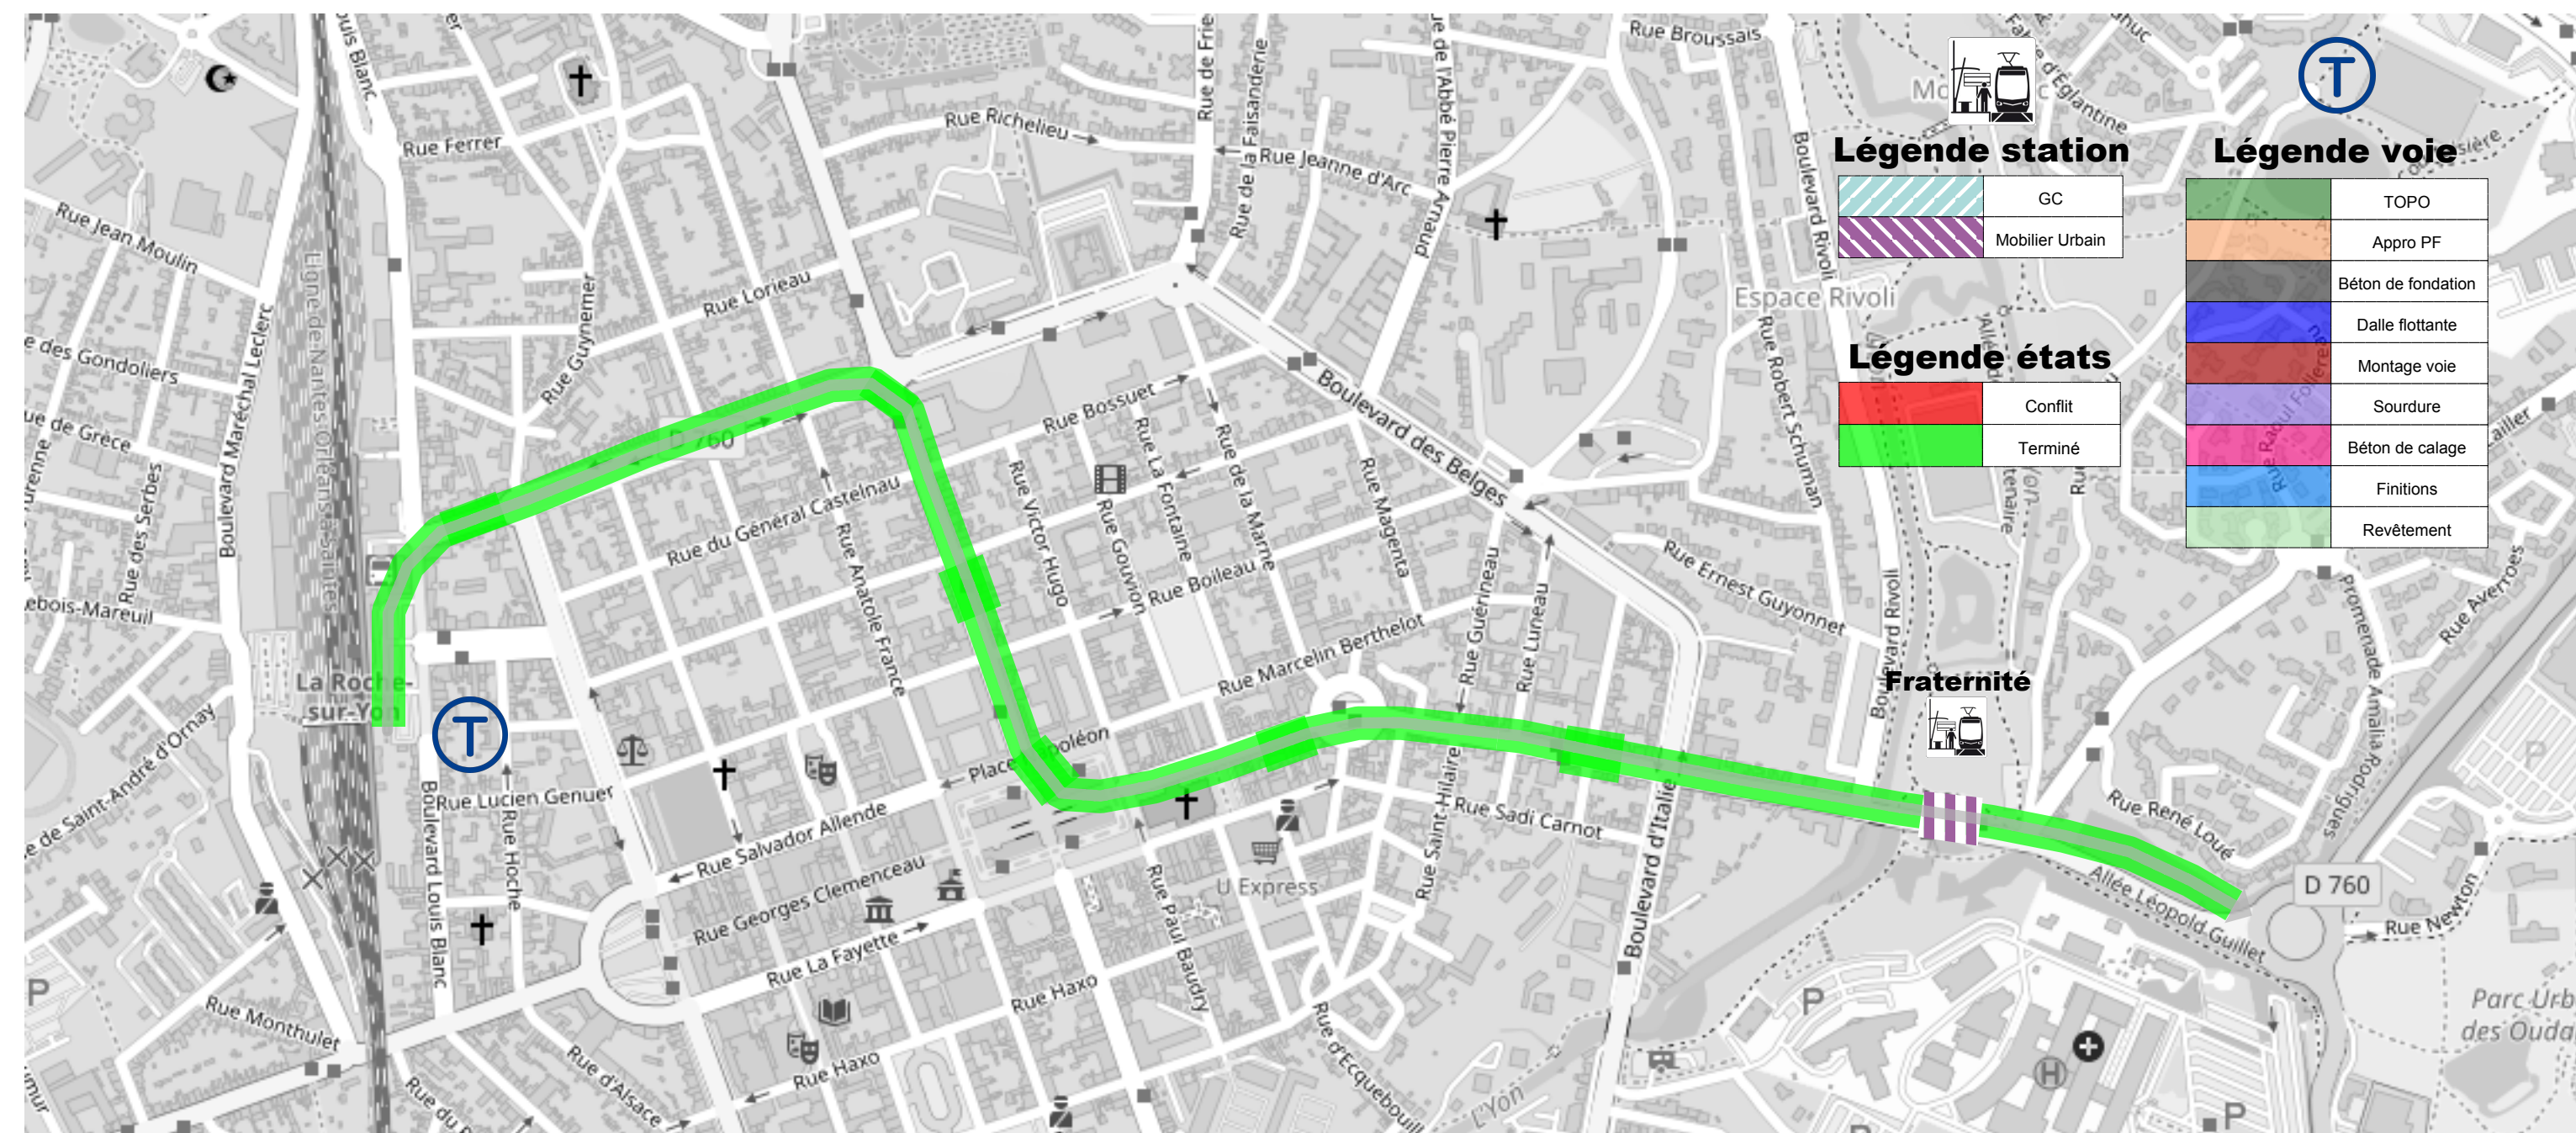

Légende station

	GC
	Mobilier Urbain


Légende voie

	TOPO
	Appro PF
	Béton de fondation
	Dalle flottante
	Montage voie
	Soudure
	Béton de calage
	Finitions
	Revêtement


Légende états

	Conflit
	Terminé

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00													
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00													
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20													
Montage voie	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00													
Appro PF	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00													
Soudure	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00													
Béton de fondation	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20													
Béton de calage	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40													
Dalle flottante	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20													
Montage voie	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00													
Finitions	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00													
Revêtement	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00													
Soudure	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20													
Béton de calage	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40													
Béton de fondation	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40													
Finitions	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20													
Montage voie	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00													
Revêtement	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00													
Soudure	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40													
Béton de calage	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20													
Béton de fondation	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20													
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00													
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20													
Station Stade															
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00													
Station E.Marcel															
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00													
Station Présidents															
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00													
Station Maréchal															
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00													
Station Liberté															
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00													
Station Egalité															
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00													
Station Fraternité															
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00													
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00													

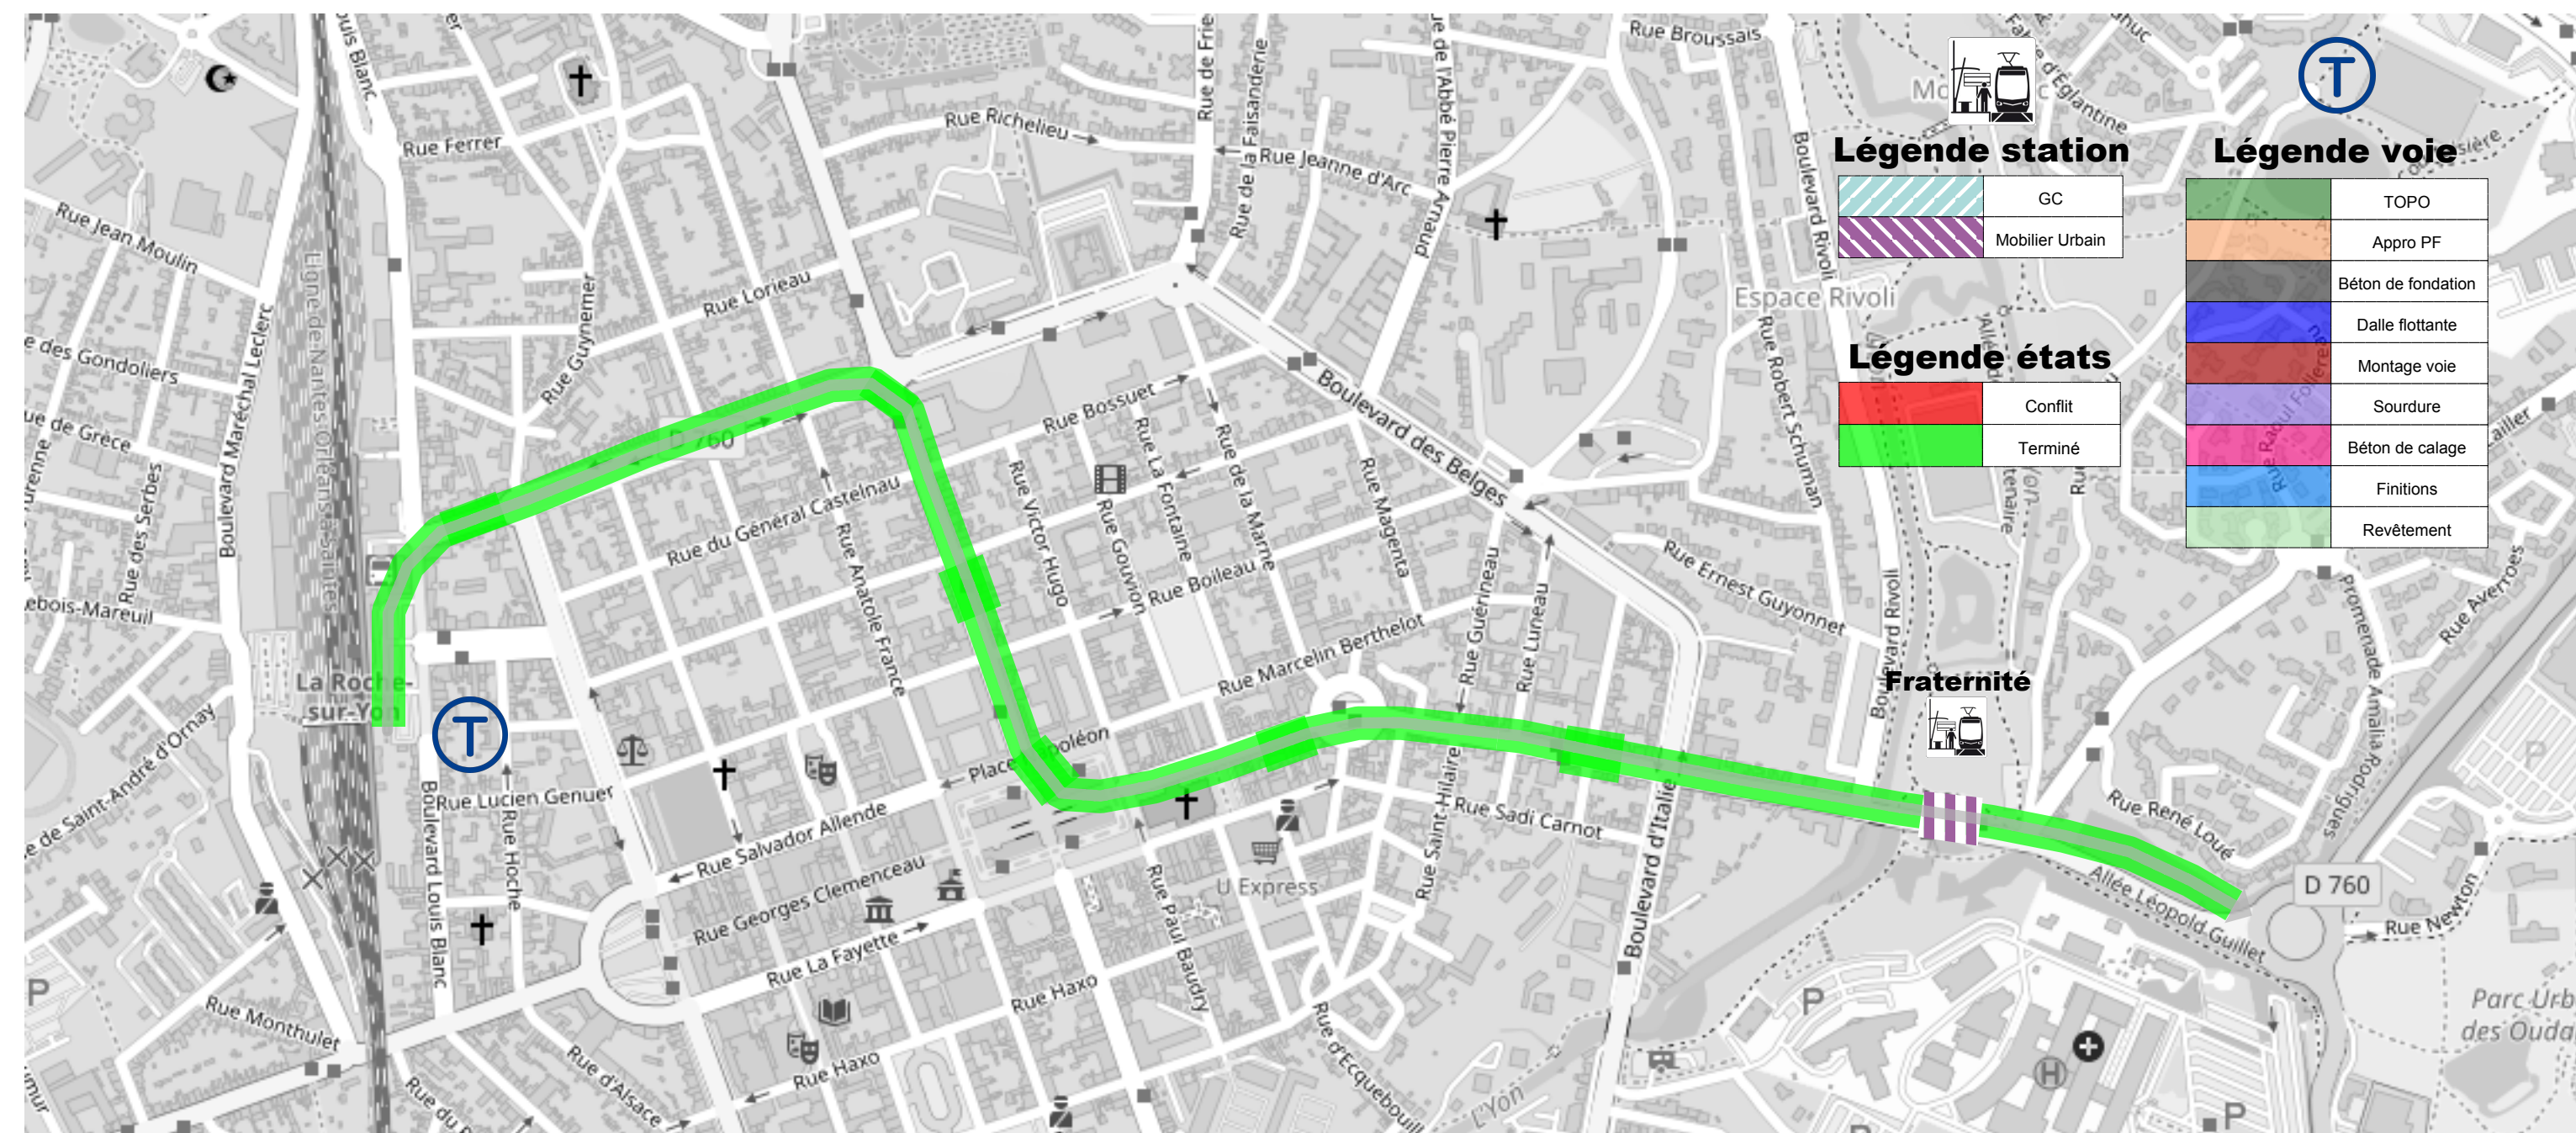

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	12/06/2019 12:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
Montage voie	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	Montage voie												
Appro PF	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Appro PF												
Soudure	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Soudure												
Béton de fondation	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Béton de fondation												
Béton de calage	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de calage												
Dalle flottante	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Dalle flottante												
Montage voie	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Revêtement												
Soudure	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de fondation												
Finitions	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Finitions												
Montage voie	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Revêtement												
Soudure	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Finitions												
Revêtement	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												

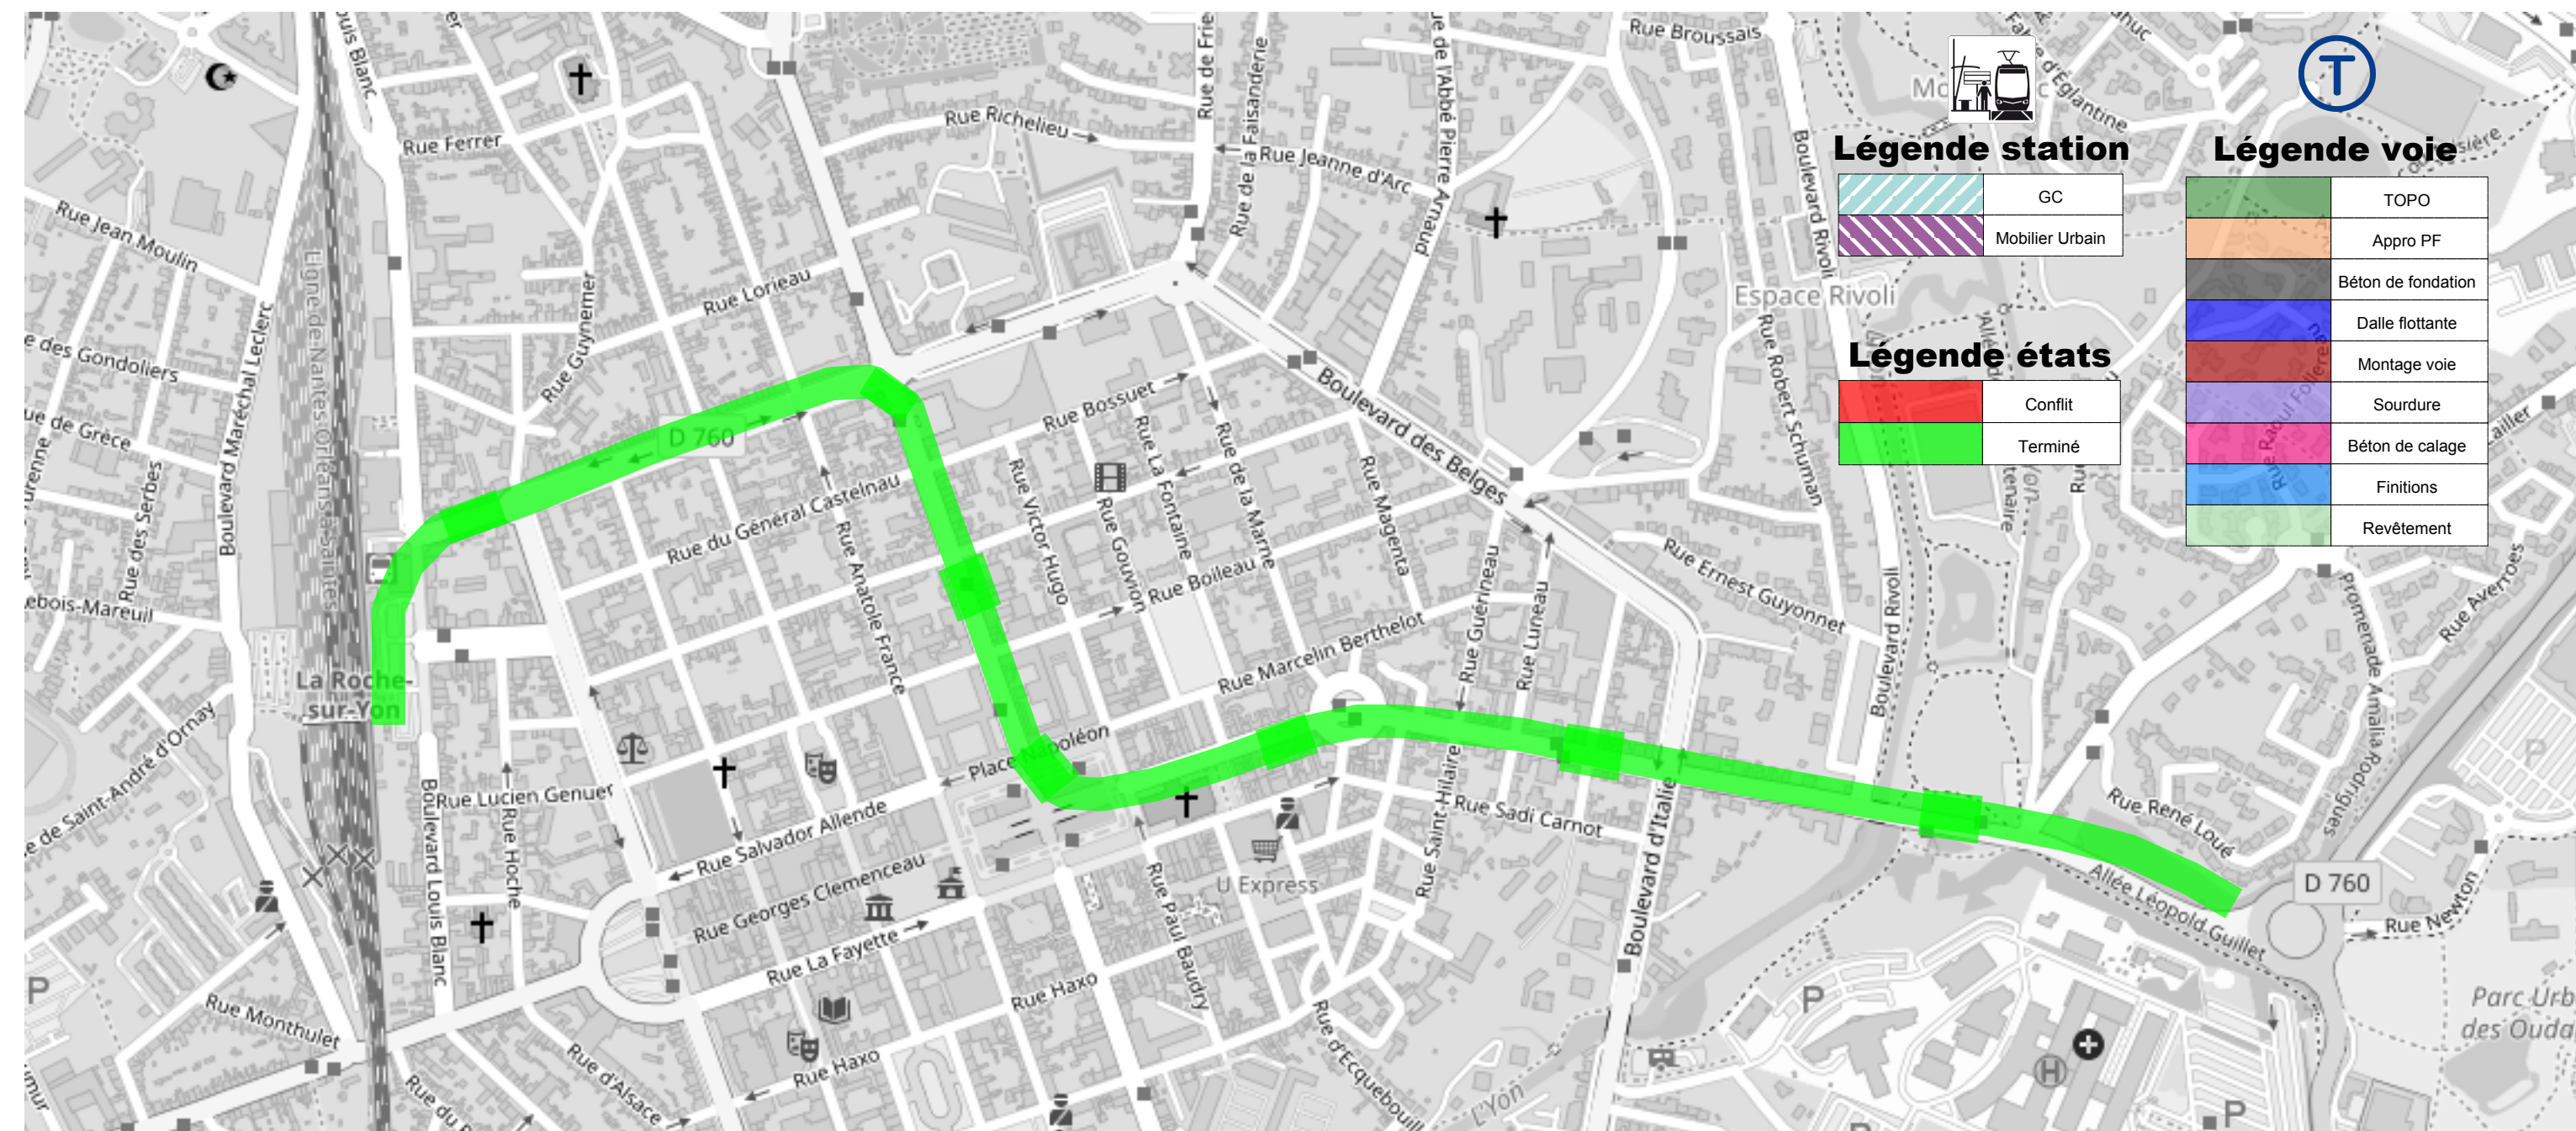

Nom (PM)	Début (PM)	Fin (PM)	2019												2020
			Mai	Jun	Juillet	Aout	Septembre	Octobre	Novembre	Decembre	Janvier				
Voies Tramway			Voies Tramway												
TOPO	17/05/2019 08:00	28/05/2019 16:00	TOPO												
Appro PF	29/05/2019 08:00	05/06/2019 16:00	Appro PF												
Béton de fondation	06/06/2019 08:00	01/07/2019 13:20	Béton de fondation												
TOPO	13/06/2019 08:00	21/06/2019 12:00	TOPO												
Montage voie	14/06/2019 08:00	11/07/2019 16:00	Montage voie												
Appro PF	20/06/2019 08:00	28/06/2019 12:00	Appro PF												
Soudure	27/06/2019 08:00	19/07/2019 13:20	Soudure												
Béton de fondation	02/07/2019 08:00	09/08/2019 10:40	Béton de fondation												
Béton de calage	04/07/2019 08:00	26/07/2019 13:20	Béton de calage												
Dalle flottante	09/07/2019 08:00	26/08/2019 16:00	Dalle flottante												
Montage voie	16/07/2019 08:00	02/09/2019 16:00	Montage voie												
Finitions	22/07/2019 08:00	02/08/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	29/07/2019 08:00	21/08/2019 13:20	Revêtement												
Soudure	31/07/2019 08:00	10/09/2019 10:40	Soudure												
Béton de calage	07/08/2019 08:00	17/09/2019 10:40	Béton de calage												
Béton de fondation	12/08/2019 08:00	11/09/2019 13:20	Béton de fondation												
Finitions	02/09/2019 08:00	24/09/2019 16:00	Finitions												
Montage voie	03/09/2019 08:00	08/10/2019 16:00	Montage voie												
Revêtement	09/09/2019 08:00	17/10/2019 10:40	Revêtement												
Soudure	17/09/2019 08:00	16/10/2019 13:20	Soudure												
Béton de calage	24/09/2019 08:00	23/10/2019 13:20	Béton de calage												
Finitions	14/10/2019 08:00	30/10/2019 16:00	Finitions												
Revêtement	21/10/2019 08:00	21/11/2019 13:20	Revêtement												
Station Stade			Station Stade												
GC - Stade	07/08/2019 08:00	28/08/2019 16:00	GC - Stade												
Mobilier Urbain - Stade	29/08/2019 08:00	11/09/2019 16:00	Mobilier Urbain - Stade												
Station E.Marcel			Station E.Marcel												
GC - E.Marcel	13/09/2019 08:00	03/10/2019 16:00	GC - E.Marcel												
Mobilier Urbain - E.Marcel	04/10/2019 08:00	17/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - E.Marcel												
Station Présidents			Station Présidents												
GC - Présidents	25/09/2019 08:00	15/10/2019 16:00	GC - Présidents												
Mobilier Urbain - Présidents	16/10/2019 08:00	29/10/2019 16:00	Mobilier Urbain - Présidents												
Station Maréchal			Station Maréchal												
GC - Maréchal	07/10/2019 08:00	25/10/2019 16:00	GC - Maréchal												
Mobilier Urbain - Maréchal	28/10/2019 08:00	12/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Maréchal												
Station Liberté			Station Liberté												
GC - Liberté	17/10/2019 08:00	07/11/2019 16:00	GC - Liberté												
Mobilier Urbain - Liberté	08/11/2019 08:00	22/11/2019 16:00	Mobilier Urbain - Liberté												
Station Egalité			Station Egalité												
GC - Egalité	29/10/2019 08:00	20/11/2019 16:00	GC - Egalité												
Mobilier Urbain - Egalité	21/11/2019 08:00	04/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Egalité												
Station Fraternité			Station Fraternité												
GC - Fraternité	12/11/2019 08:00	02/12/2019 16:00	GC - Fraternité												
Mobilier Urbain - Fraternité	03/12/2019 08:00	16/12/2019 16:00	Mobilier Urbain - Fraternité												
